




การดำเนินการโครงการ

กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565


ข้อมูลทั่วไป กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

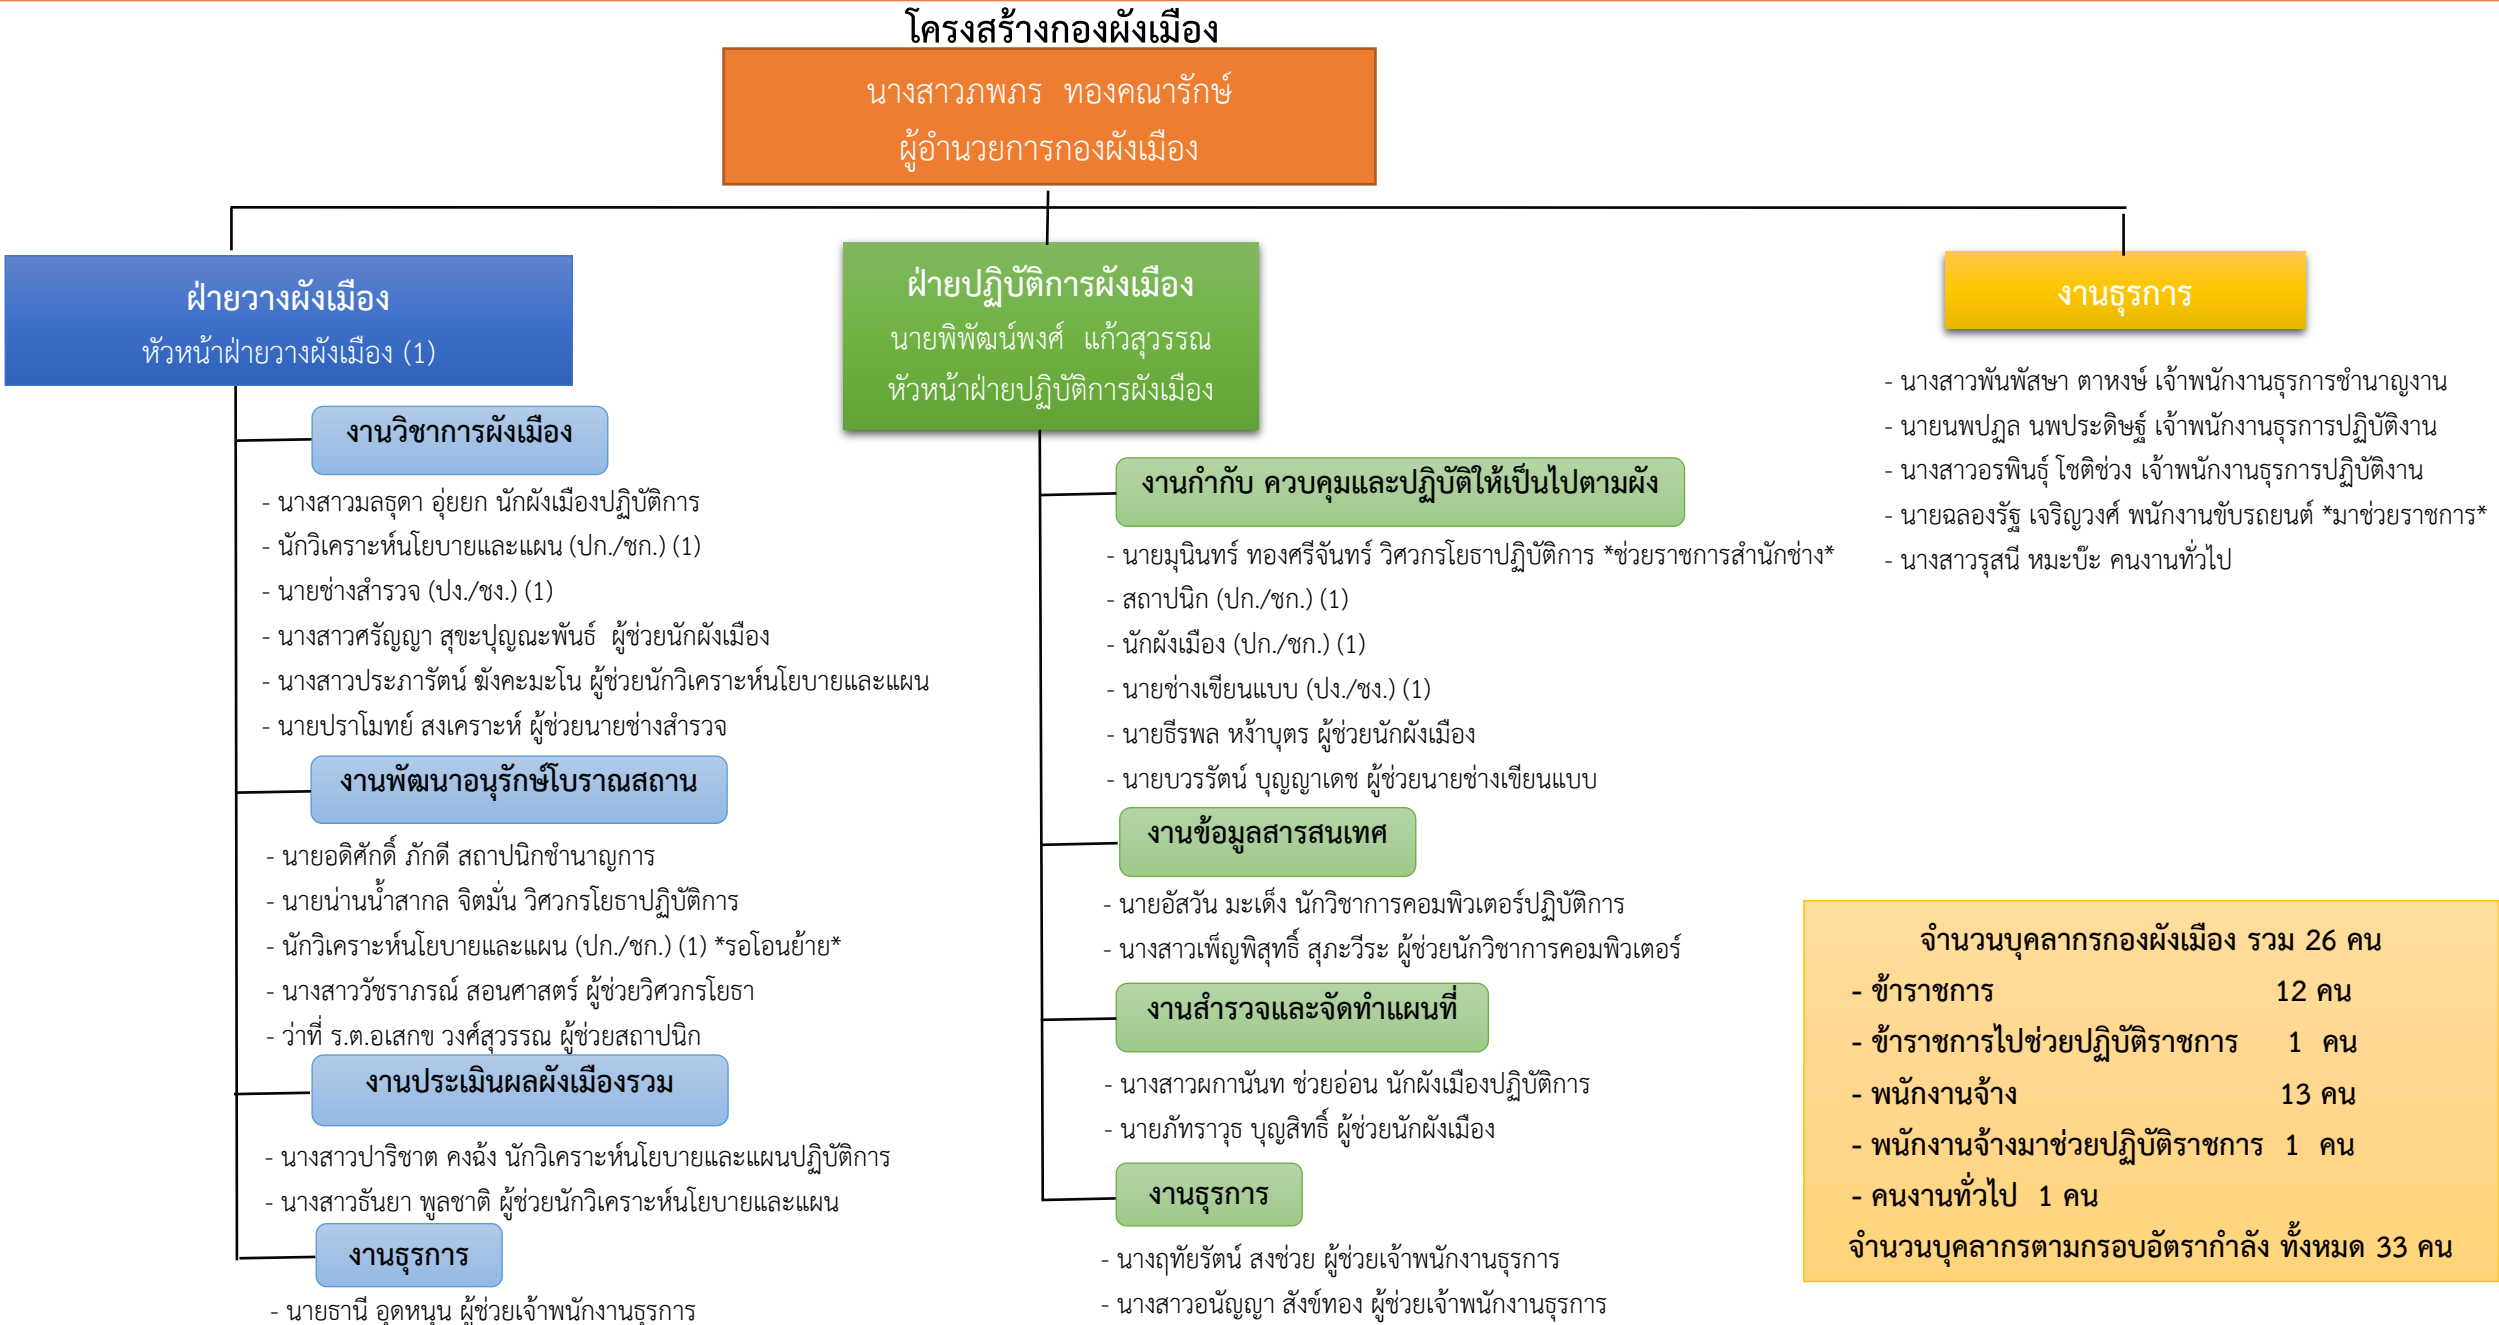

การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ 47,126,400 บาท

ขออนุมัติแล้ว
42,167,521.33 บาท

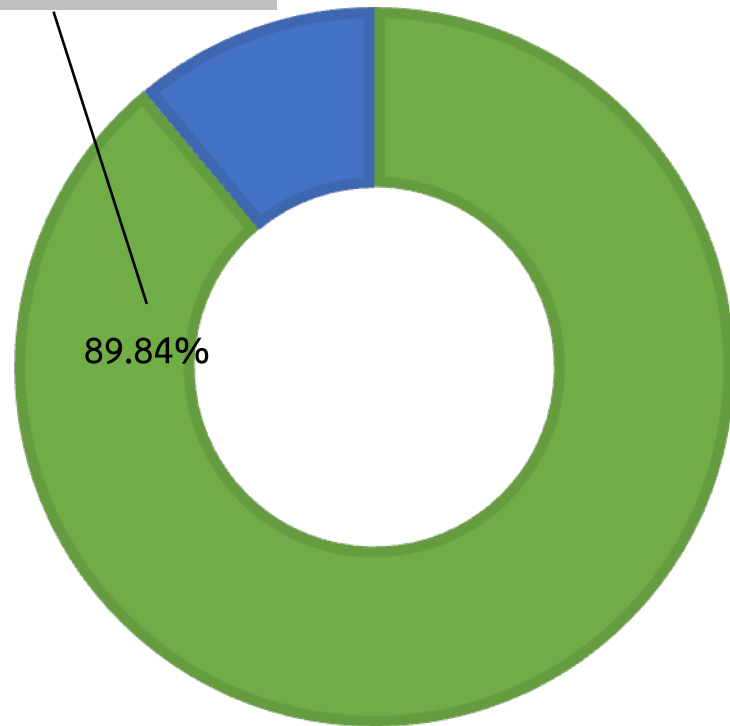


ก่อนนี้แล้ว 38,817,521.33 บาท (82.37%)

เบิกจ่ายแล้ว 9,457,521.33 บาท (20.07%)

เงินนอกงบประมาณ เงินกันปี พ.ศ. 2563 - 2564

งบประมาณ 85,400,000 บาท

ขออนุมัติแล้ว
85,400,000 บาท



ก่อนนี้แล้ว 85,160,000 บาท (100 %)


เบิกจ่ายแล้ว 59,588,000 บาท (69.78 %)

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา

งบประมาณ 5,985,000 บาท

ผู้รับจ้าง/สัญญา	บริษัททีแอลอินเตอร์เทรด จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 116/2555 เริ่มสัญญา 27 มี.ค.55 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.56 ระยะเวลา 540 วัน จำนวน 10 งวดงาน
ผลการดำเนินงาน	ปัจจุบันอยู่ในงานงวดที่ 9/10 (ปิดประกาศ พร้อมข้อกำหนด 90 วัน และการพิจารณา คำร้อง ตาม พรบ. การผังเมือง พ.ศ. 2518) และตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 อยู่ในขั้นตอนที่ 5/8 ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด
	1. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 ได้มีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวางและจัดทำ ผมร. ท่าเรือน้ำลึก <u>มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการตามมติคณะกรรมการผังเมือง ในการจัดประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนใหม่ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามขั้นตอน โดย อบจ.สงขลา เป็นผู้ดำเนินการ</u> 2. ให้มีหนังสือหรือกองพัสดุฯ ในการบริหารสัญญาจ้าง กรณีที่ 1 แก้ไขสัญญาเดิม เพิ่มงาน เพิ่มเงิน กรณีที่ 2 แยกสัญญาจ้างใหม่ 3. ทหารหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารสัญญาจ้าง โครงการฯ

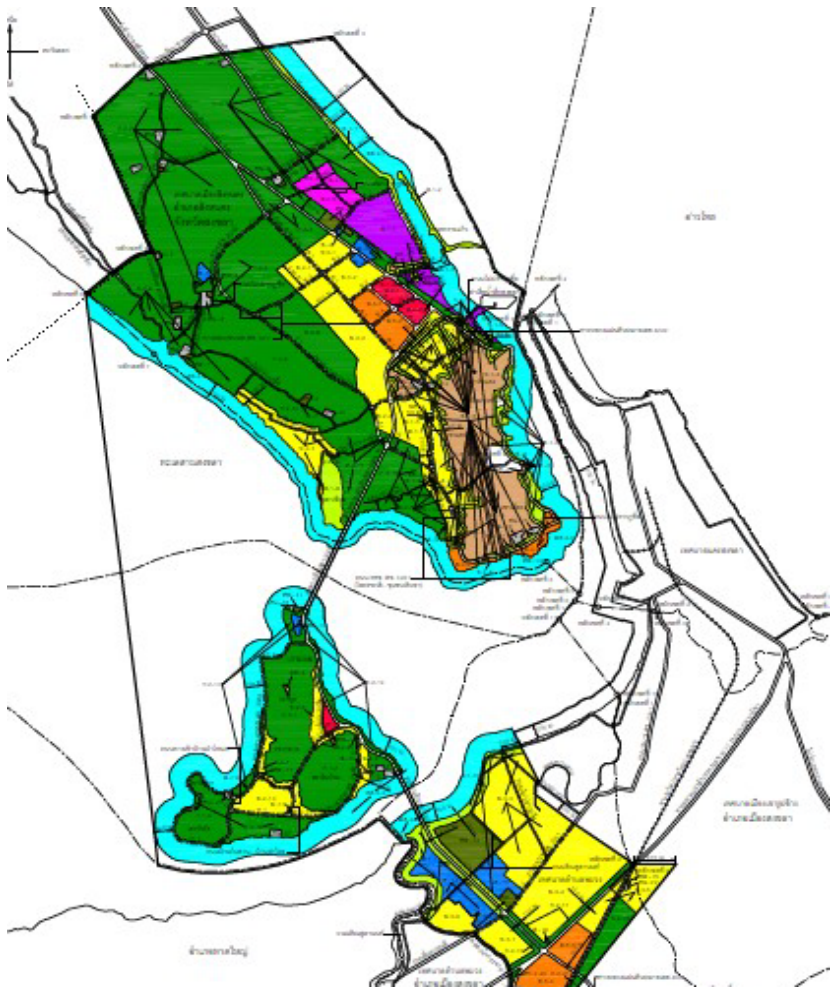


การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะจังหวัดสงขลา

Project Timeline “วางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนจะนะ”



กระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กรณีดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

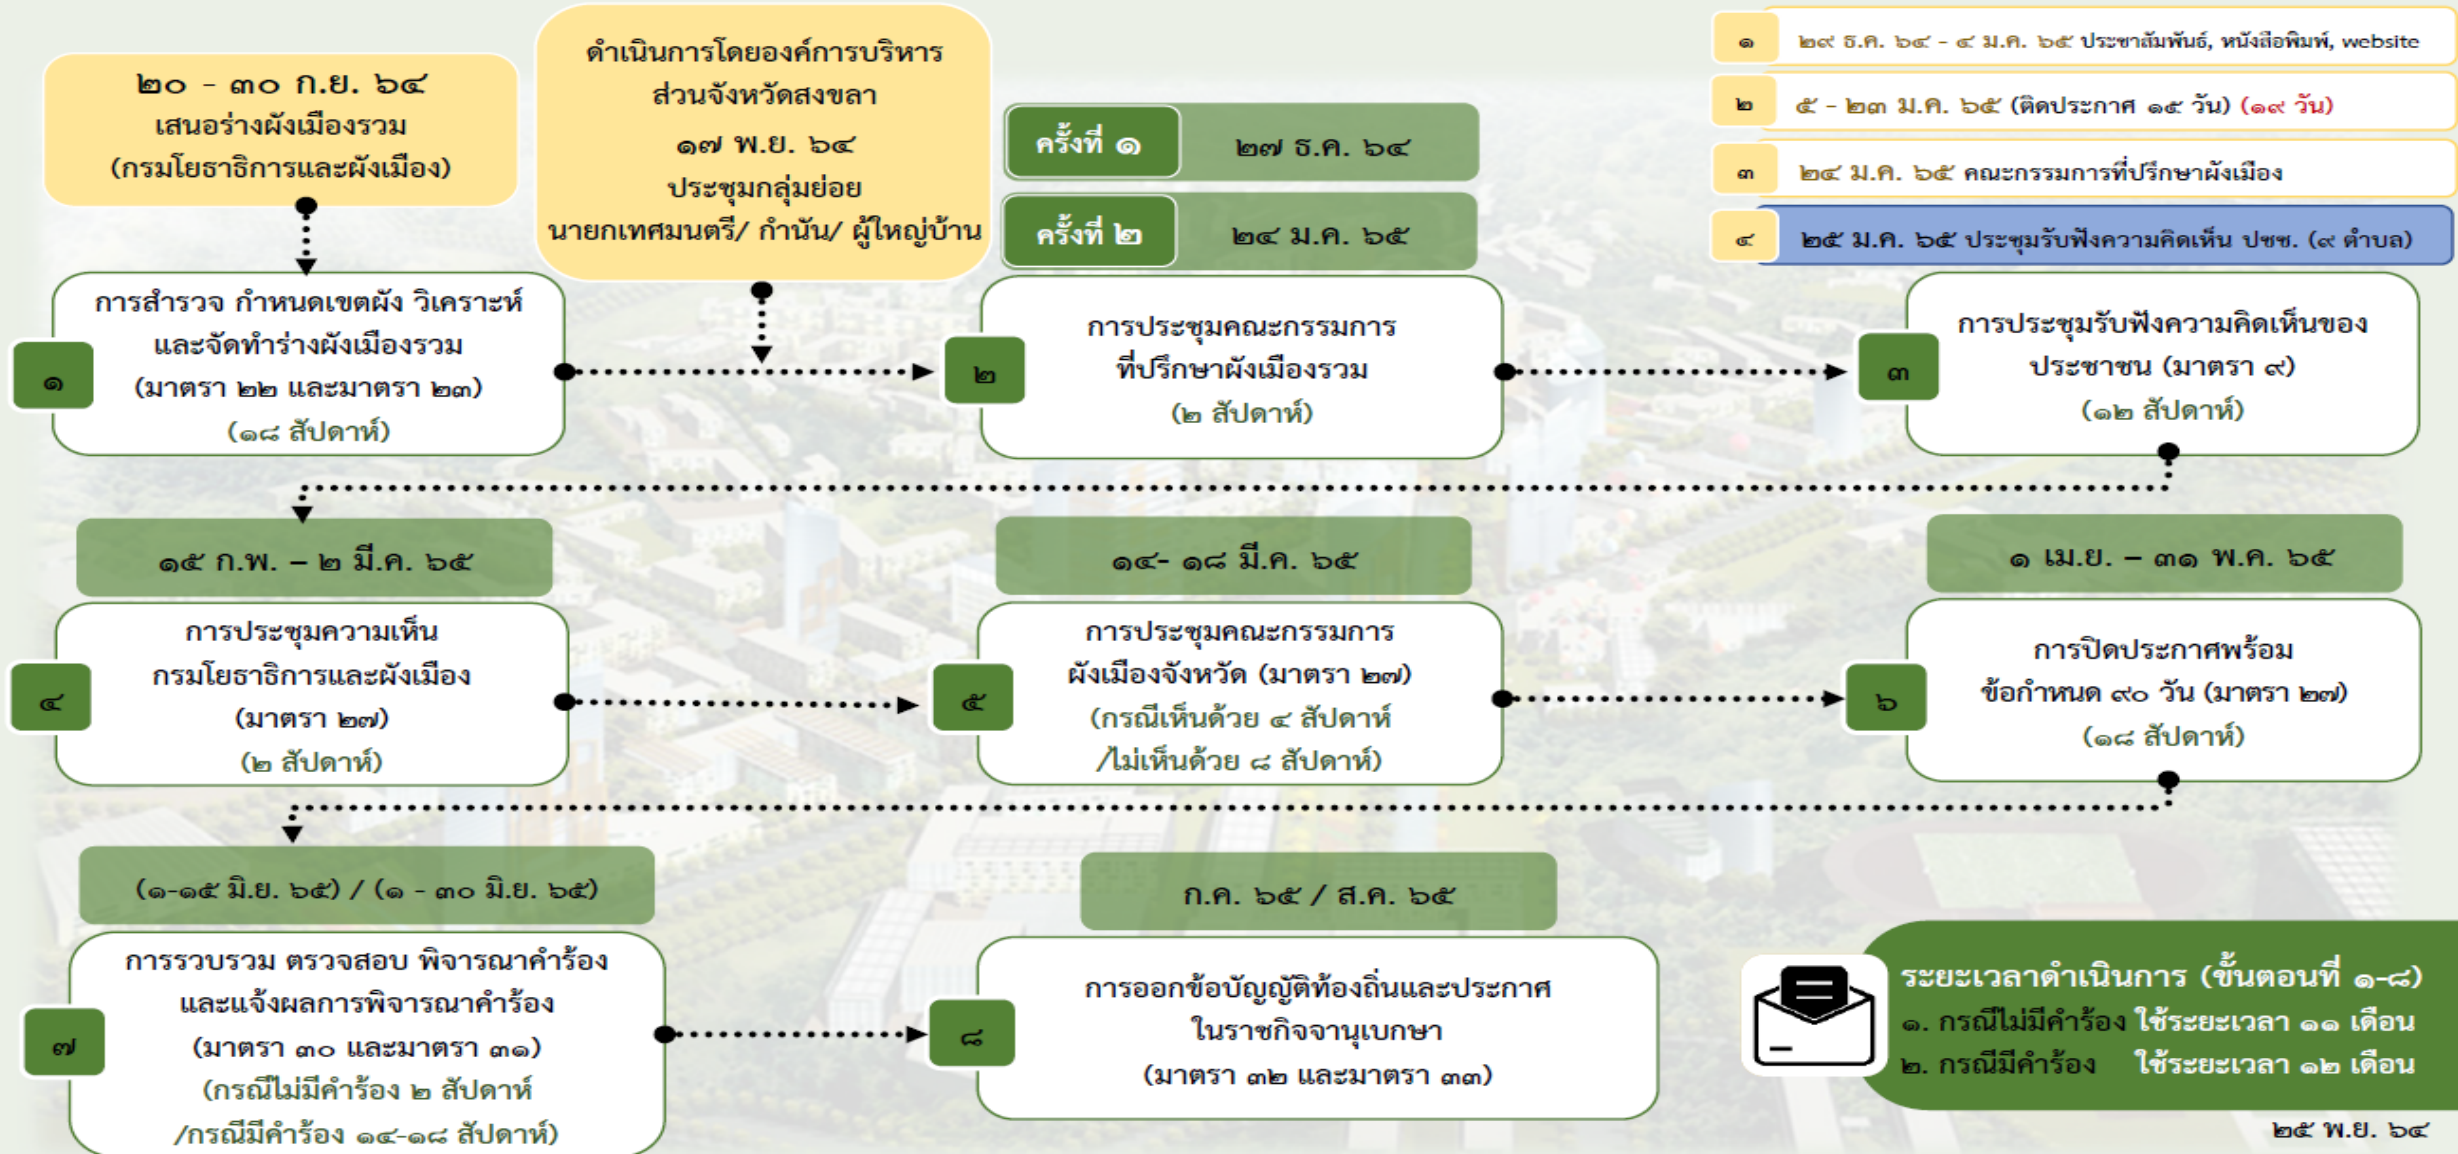


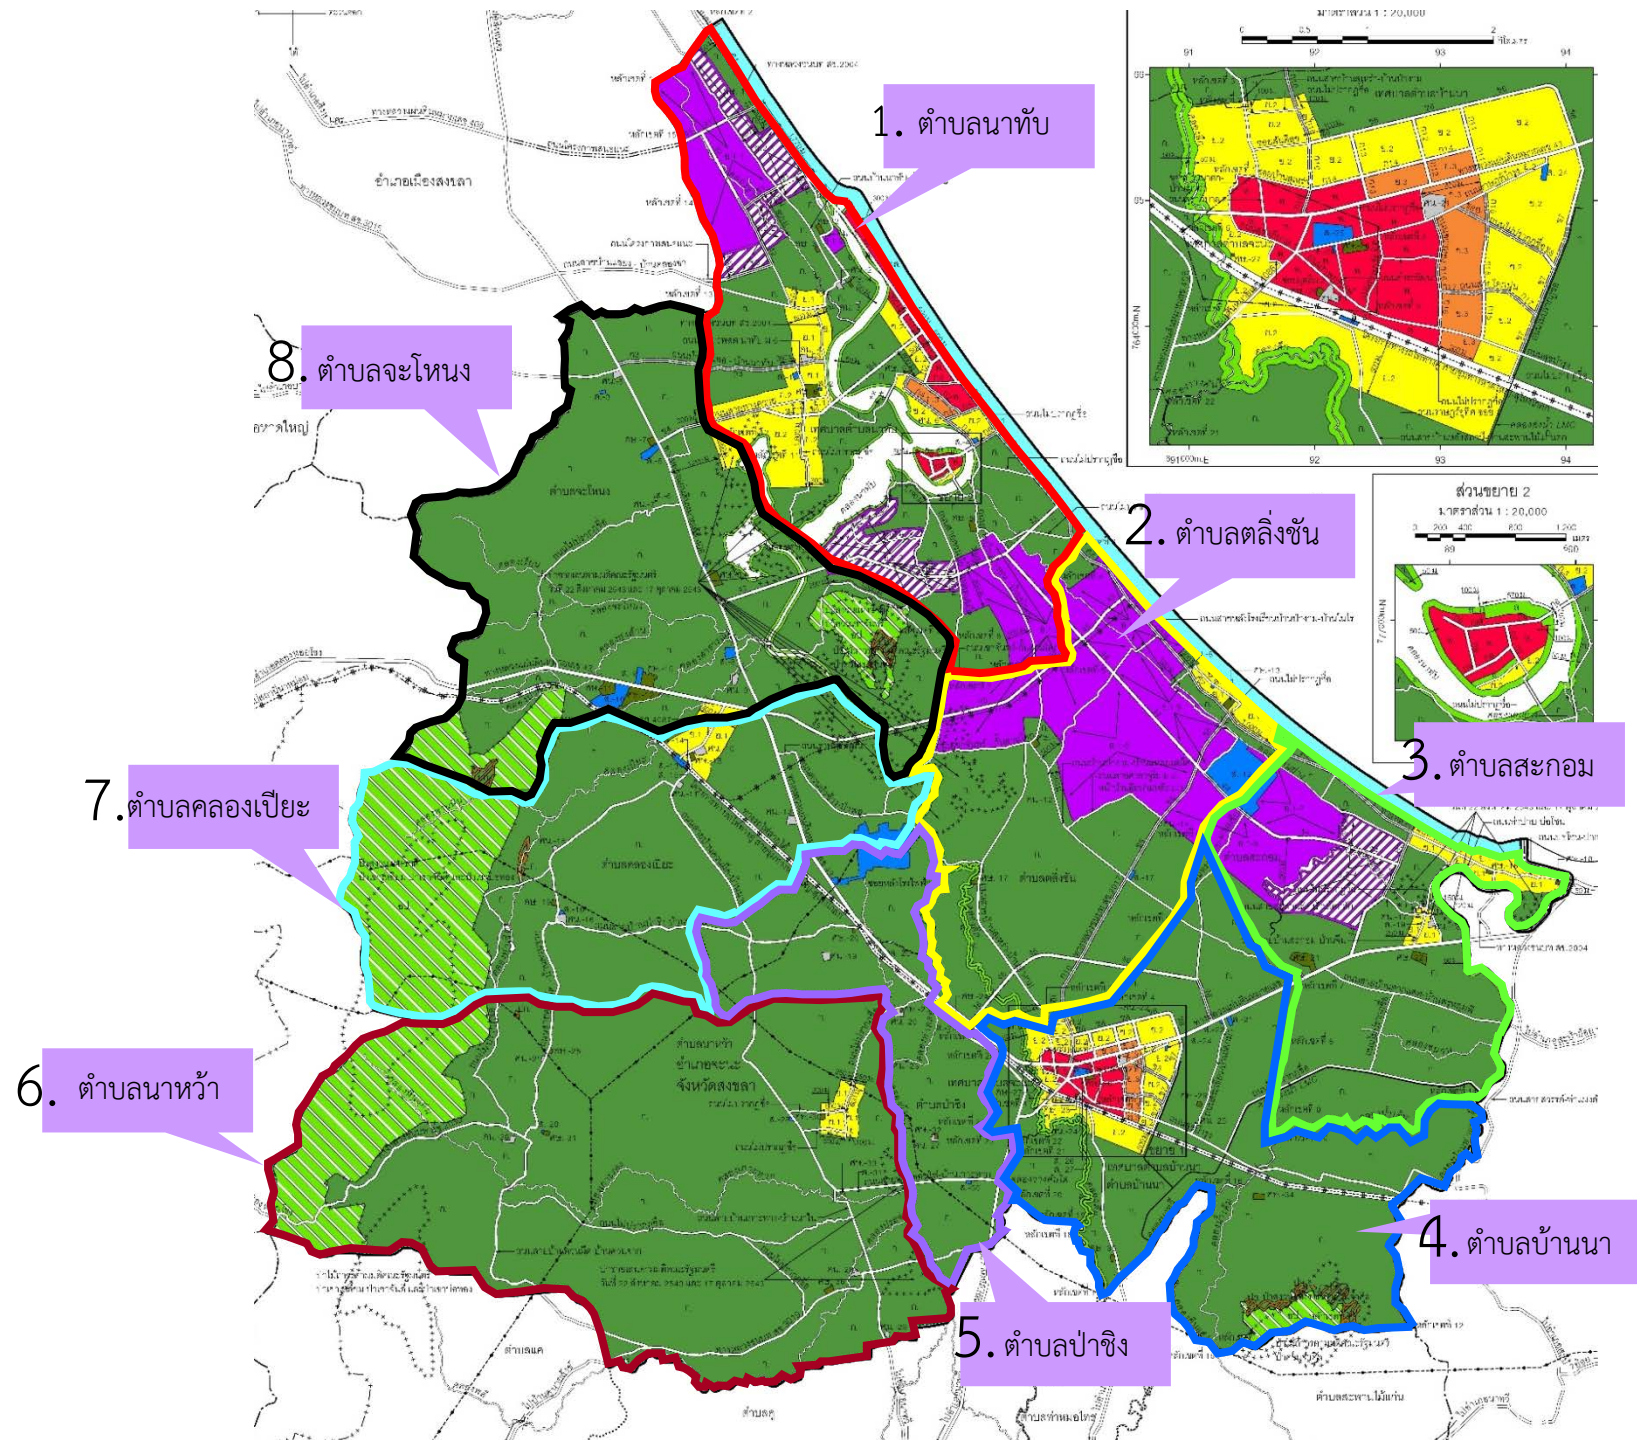


องค์ประกอบของผังเมืองรวมชุมชนจะนะ จังหวัดสงขลา




แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม

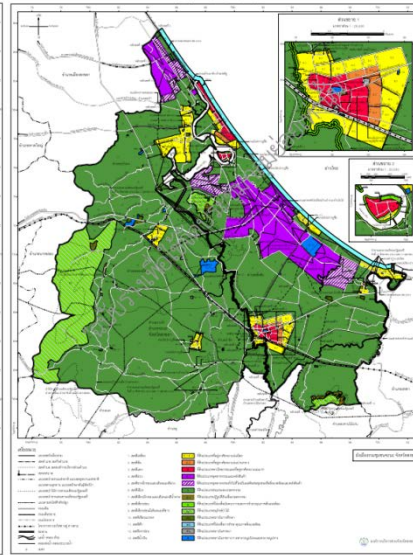


แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

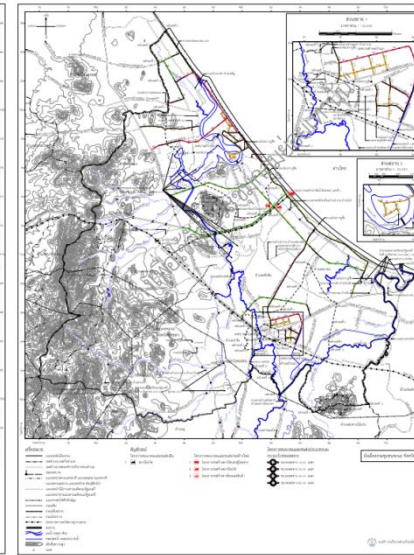

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

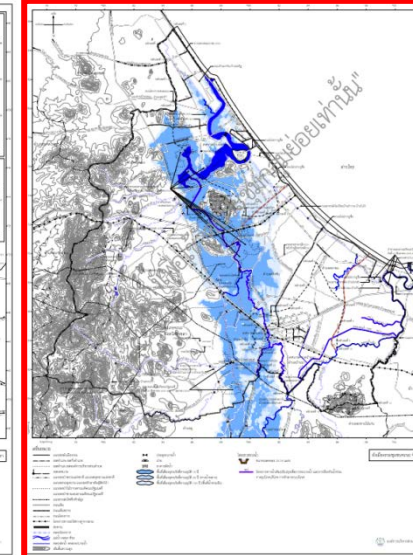


แผนผังแสดงผังน้ำ

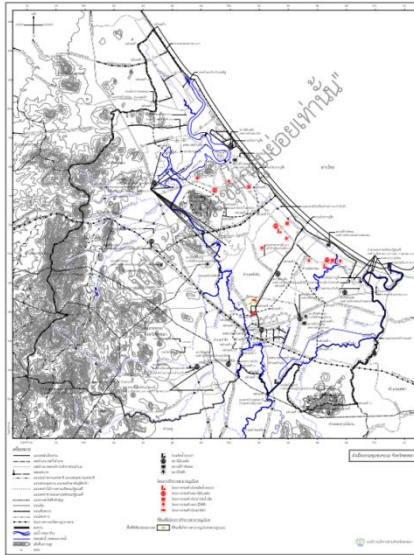


แผนผังแสดงโครงการจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ (ผังสาธารณูปโภค)



แผนผังแสดงโครงการจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ (ผังสาธารณูปการ)

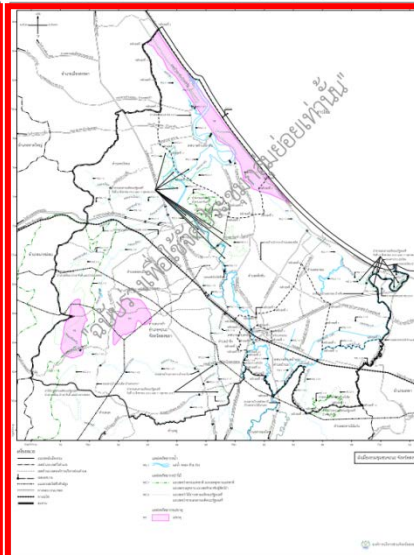

แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

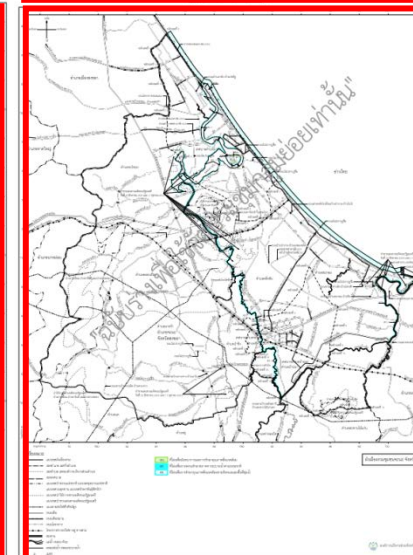

แผนผังแสดงที่ตั้ง

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด

สงขลา

มูลค่าโครงการ 17,586 ล้านบาท

ขั้นตอน EIA

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สัญญาจ้างเลขที่ 081/2561 เริ่มสัญญา 26 เม.ย. 61 สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค. 61 ระยะเวลา 240 วัน จำนวน 6 งวดงาน

- ประชุมพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ครั้งที่ 1 (15 ก.ค. 59)
 - ครั้งที่ 2 (16 มี.ค. 61)
 - ครั้งที่ 3 (3 พ.ค. 63)
 - ครั้งที่ 4 (5 มิ.ย. 63)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีมติให้ปรับปรุง แก้ไขรายละเอียด ในคราวประชุม เมื่อ 5 มิ.ย. 63

สผ. **เห็นชอบ** รายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 (25 ม.ค. 64)

ที่ประชุม กก.วล.มีมติ**เห็นชอบ**ให้ อบจ. สงขลา ดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้กับ กกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรม.รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 (25 พ.ค. 64)

ขั้นตอนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กระทรวงมหาดไทยได้**ให้ความเห็นชอบ**ในหลักการเรียบร้อยแล้ว

ส่งรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ให้ สคร. เพื่อพิจารณา **พ.ร.บ.ร่วมลงทุน พ.ศ. 2556**

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 มีการประชุมหารือโครงการระบบราง สคร. ขอให้ อบจ. สงขลา จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ

สคร. ได้มีการประชุมหารือโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 **มติที่ประชุม**ขอให้ อบจ. สงขลา **เพิ่มเติมข้อมูลโครงการ และส่งให้ สคร. พิจารณาต่อไป**
(อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม)

นำเสนอเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา



ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

	การเสนอโครงการ				การคัดเลือกเอกชน			
ขั้นตอนการดำเนินการ (Milestone)	การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ (FS) แล้วเสร็จ	รณว.ให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการ (2 เดือน)	การนำเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ (4 เดือน)	การนำเสนอกรม.พิจารณา (2 เดือน)	แต่งตั้งคกก.คัดเลือก	คณะกรรมการคัดเลือกให้ความเห็นชอบร่าง RFP และประกาศเชิญชวนเอกชน (9-12 เดือน)	การลงนามในสัญญา	เปิดให้บริการ
กรอบเวลา	ปลายเดือน ส.ค. 63	ก.ย. 63	 มี.ค. 65 – ธ.ค. 65 - ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 63 - ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64 - ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 - ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65	ส.ค. – ก.ย. 65	ต.ค. 65	ม.ค. 66 – ม.ค. 70		มี.ค. 70
						- ปี 66 คัดเลือก (1 ปี) - ปี 67 -70 ลงนามในสัญญาและก่อสร้าง (3 ปี)		

อยู่ระหว่างเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ และหลักการของโครงการฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน



การดำเนินงานปัจจุบัน

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา

งบประมาณก่อสร้าง 669.7 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บ.อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด

1

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2

ได้มีหนังสือส่งเอกสารเพิ่มเติมขอจัดตั้ง และดำเนินการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณา และขออนุญาต จัดตั้งดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร


- 1. สนง.ขนส่งสงขลา ได้ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวม รายงานให้กรมการขนส่งทางบกทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มี.ค 65
- 2. ผู้บริหารได้สั่งการให้สำนักงานช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 3. ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมให้กงคลังรับผิดชอบ

3

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดสงขลา เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สนง.ขนส่งจังหวัดสงขลาจัดส่งข้อมูลให้ กรมการขนส่งทางบก พิจารณา

4

สำนักงานขนส่ง จ.สงขลา จัดส่งข้อมูลให้กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจัดให้มี จัดตั้ง และการกำกับ ดูแลการดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้ความเห็นชอบให้ อบจ.สงขลา จัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร

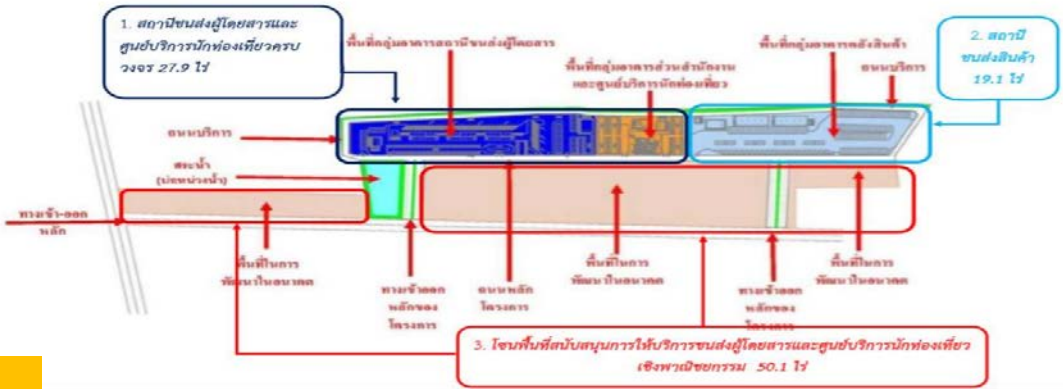

ปัจจุบัน → แจ้ง สป. ดำเนินการแจ้งผู้บุกรุกให้รื้อถอนต้นไม้ แจ้งสำนักช่าง ดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่

แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ งานก่อสร้างโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

[illegible]

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์ ขนาด 50 เมตร

งบประมาณก่อสร้าง 75,000,000 บาท

ส่งมอบงานมาแล้ว

12/12 งวดงาน

เบิกจ่ายแล้ว 56,100,000 คงเหลือ 18,700,000

ผลการปฏิบัติงานรวมคิดเป็น

99.99 %

เกินระยะเวลาตาม

สัญญา

104 วัน (-17.33)

บริษัท พีเคพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

เริ่ม 8 พ.ค. 63

1

2

3

4

สิ้นสุด 29 ธ.ค. 64

5

ระยะเวลาดำเนินงาน 600 วัน




ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาติลสุลวานนท์ ขนาด 50 เมตร
เริ่ม 8 พ.ค. 63 สิ้นสุด 29 ธ.ค. 64

แผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง

งบประมาณ 74,800,000.00 บาท
ระยะเวลา 600 วัน

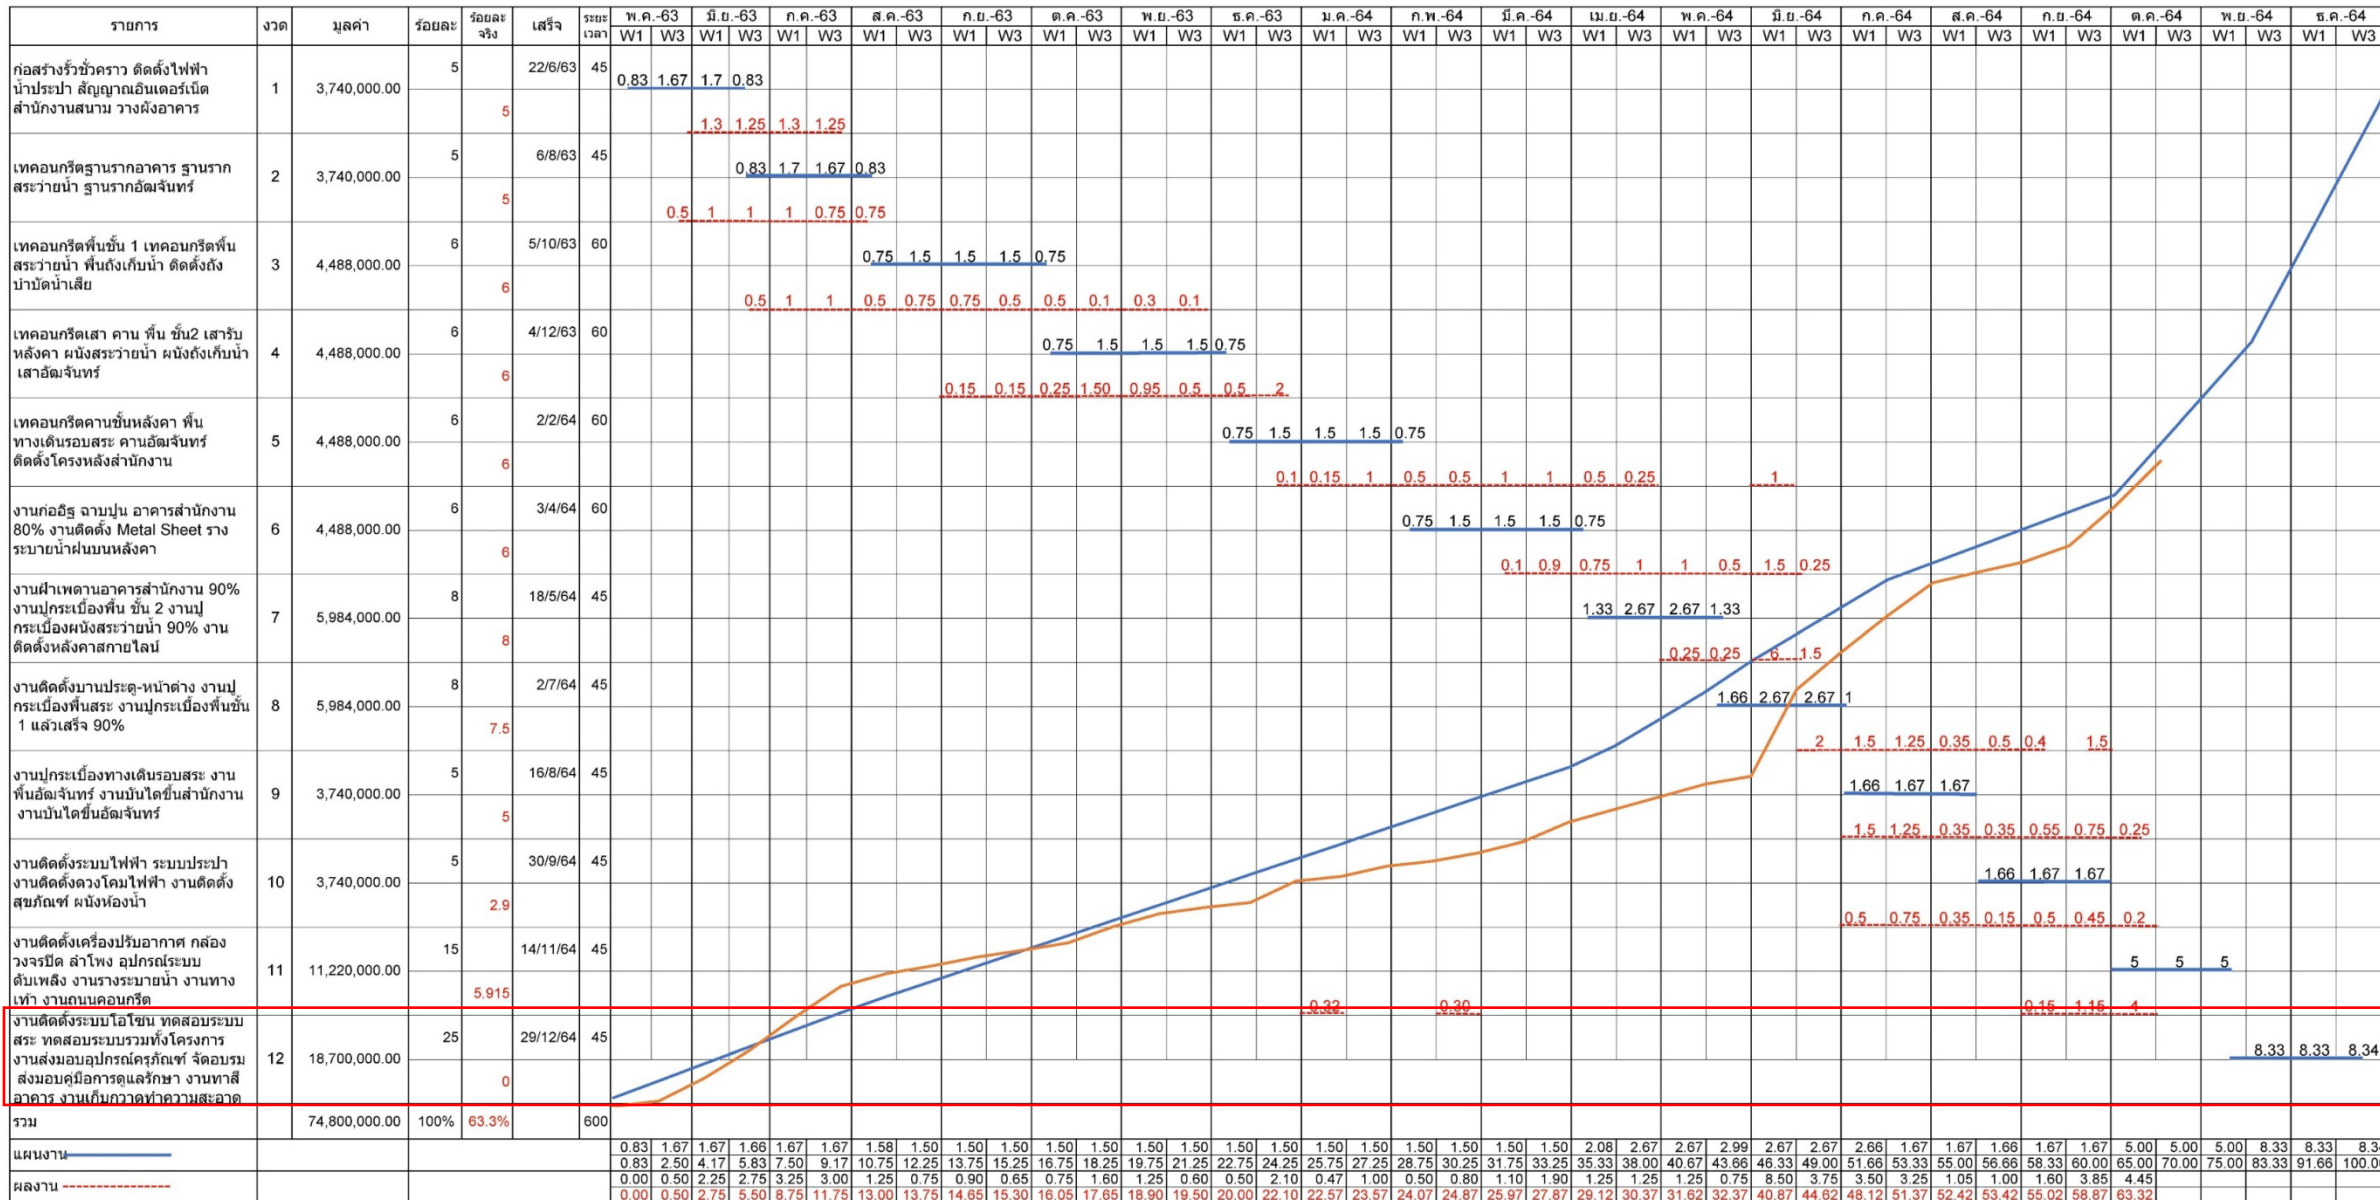

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (งบประมาณ 7,500,000 บาท)

มูลค่าโครงการ 2,254.55 ล้านบาท

ขออนุมัติโครงการ

1

วันที่ 21 พ.ค. 63

ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงาน
ที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง

2

วันที่ 31 ส.ค. 63

คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา

3

พ.ค. - ก.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4

วันที่ 23 ก.ค. 64

ลงนามในสัญญาจ้าง

5

วันที่ 22 ก.ย. 64

ดำเนินการโครงการฯ

240 วัน (8 เดือน) 23 ก.ย. 64 – 20 พ.ค. 65

6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
&
บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรมลาгуน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา



1) คลองอู่ตะเภา บริเวณสะพานบ้านหาร (X.181)
ปตร.ปากคลองท่าช้าง-บางกล่ำ อ.บางกล่ำ



2) คลองภูมิภักดี (คลอง ส.1)
ณ บริเวณ ปตร.ท่าช้าง-บางกล่ำ อ.บางกล่ำ



แผนดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายละเอียดของกิจกรรม	พ.ศ.2562						พ.ศ. 2563						พ.ศ. 2564						พ.ศ. 2565															
		ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา	↔																																	
2	กองผังเมืองตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2																																		
3	ประชุมหารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2							↔																											
4	อบจ.สงขลา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563										↔																								
5	ประชุมคณะกรรมการ TOR โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2										↔																								
6	ขออนุมัติ TOR และขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ											↔																							
7	ประกาศ TOR เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563																																		
8	อบจ.สงขลา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563														↔																				
9	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ราย															↔																			
10	คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาพิจารณาผล วันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คณะกรรมการมีมติยกเลิกการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ																↔																		
11	นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลาปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้สั่งการให้รอการดำเนินการจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่มาจากการเลือกตั้ง																	↔																	
12	ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ																		↔																
13	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3 ราย																			↔															
14	จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 240 วัน (23 ก.ย 64 - 20 พ.ค 65)																				↔														
15	การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																				↔														
16	เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 30 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1-10) , ช่วงที่ 2 (ปีที่ 11-30)																														↔				

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 6 clusters ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณ 2,500,000 บาท

1

2

3

4

5

6

7

8

ขออนุมัติโครงการ

ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง

คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ลงนามในสัญญาจ้าง

ดำเนินการโครงการฯ
180 วัน (6 เดือน) 12 ต.ค. 64 – 9 เม.ย. 65
(ขยายระยะเวลา 45 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 24 พ.ค. 65)

หมายเหตุ

★

การดำเนินการปัจจุบัน

วันที่ 16 เม.ย. 63

วันที่ 10 มิ.ย. 64

ส.ค.- ก.ย. 64



วันที่ 13 ก.ย. 64
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 11 ต.ค. 64


ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65

ตรวจรับงานงวดที่ 3

ตรวจรับงานงวดที่ 4
24 พ.ค. 65

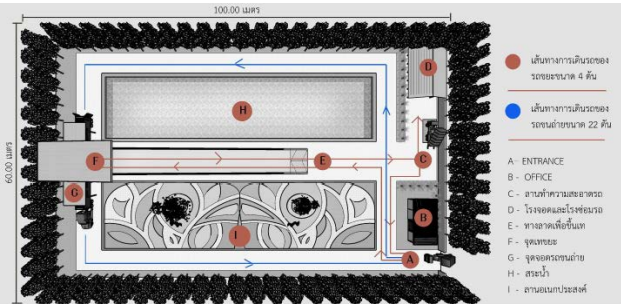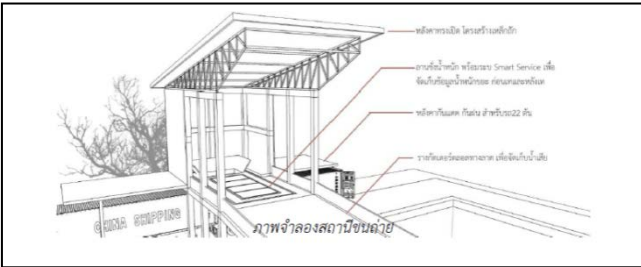

แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของสถานีขนถ่าย โดยกำหนดกิจกรรมที่สำคัญในการใช้พื้นที่

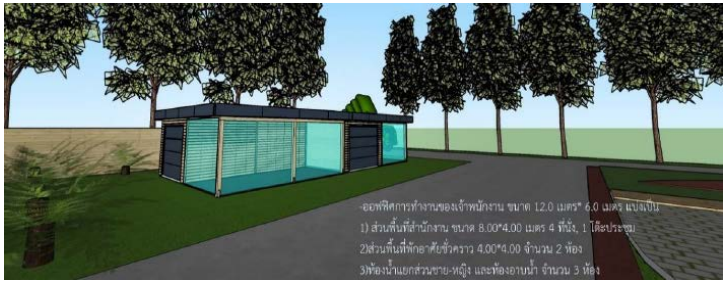

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วัดประดิษฐ์โสโมสร
ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรจะนะ
ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา



แผนการดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบสถานียขนถ่ายขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

[illegible]

การจัดกลุ่มพื้นที่ที่เหมาะสม

สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

สรุปรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้าย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

อำเภอ	หน่วยงาน	สการ อนุมัติแล้ว	ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว	ปริมาณขยะ(ตัน)
อำเภอเมืองสงขลา				
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	✓	✓	
2	เทศบาลนครสงขลา	รอพิจารณา	สการ เติมนครนายก MOU	90
เบื้องต้นมี เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐				
3	เทศบาลเมืองจตุรัสสงขลา	รอพิจารณา		35
4	เทศบาลตำบลสะบะ	✓	✓	23
5	เทศบาลตำบลเกาะแก้ว	✓	✓	3.7
สการ เติมนครนายก MOU				
เบื้องต้นมี เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐				
6	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอย	✓	✓	3.5
7	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	✓	✓	1.5
อำเภอหาดใหญ่				
8	เทศบาลเมืองทุ่งสง	✓	✓	2
9	เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	✓	✓	30
10	เทศบาลตำบลคูเต่า	✓	✓	4
11	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	✓	✓	5
12	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่	✓	✓	1.58
13	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเตย	✓	✓	18.3
อำเภอควนกาหลง				
14	เทศบาลตำบลท่าช้าง	✓	✓	10
15	เทศบาลตำบลบ้านนา	✓	✓	1.5
16	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	✓	✓	0.62
17	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ	✓	✓	3.64
อำเภอควนเนียง				
18	เทศบาลตำบลนาบอย	✓	✓	6.77
19	องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอย	✓	✓	4.51

บริเวณพื้นที่ตำบลคูเต่า

บริเวณพื้นที่ตำบลท่าข้าม

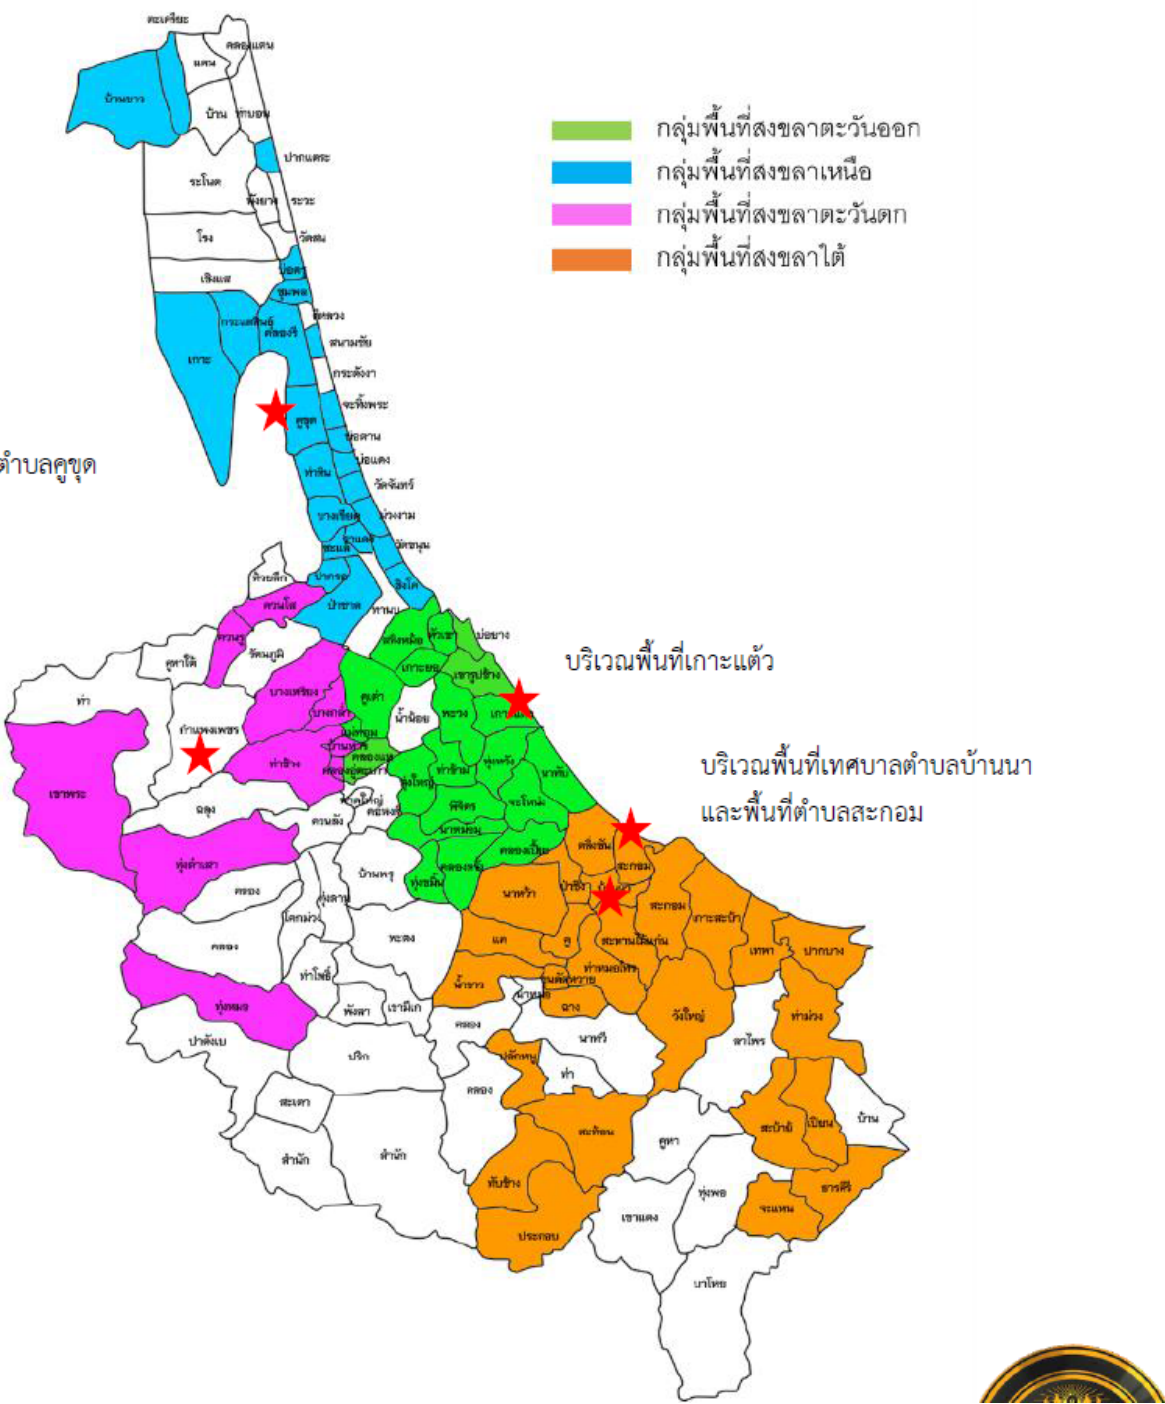



โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1. โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอย) เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยบริษัททีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) **งบประมาณ 2,125,000,000 บาท**

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64 ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 บริษัท ทีพีโอฯ ได้มีหนังสือขอเพิ่มปริมาณจำหน่ายไฟฟ้าจาก 7.92 MW เป็น 9.9 MW
 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 ได้แจ้งบริษัท ทีพีโอฯ จัดทำรายละเอียดประกอบการขอเพิ่มปริมาณจำหน่ายไฟฟ้า
 เมื่อวันที่ 1 เม.ย 65 บริษัท ทีพีโอฯ ได้ส่งรายละเอียดประกอบการขอเพิ่มปริมาณจำหน่ายไฟฟ้า
 เมื่อวันที่ 9 และ 15 ม.ค. 65 มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำรายงาน CoP ขณะนี้บริษัททีพีโอฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน CoP เพื่อเสนอต่อ กกพ. พิจารณาและออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสัญจรเข้า – ออกโครงการ
 เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 อบจ.สงขลา ได้ขอความอนุเคราะห์ ทต.เกาะเต่าออกแบบแปลนถนนเป็นเส้นเข้า-ออกโครงการ
 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 ทต.เกาะเต่าได้ส่งแบบแปลนถนนเป็นเส้นเข้า-ออกโครงการ
 เมื่อวันที่ 7 เม.ย 65 อบจ. สงขลา ได้ขอความอนุเคราะห์ออกแบบถนนเพิ่มเติม

2. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (งบประมาณจาก บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)) **งบประมาณ 35,000,000 บาท**

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 ได้มีการลงนามสัญญาจ้างบริษัทกรีนโกรว์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
 การประชุมคณะกรรมการควบคุมงานฯ
 1) ขออนุมัติรายชื่อผู้ควบคุมงาน (ระยะก่อสร้าง) และขออนุมัติแผนงาน (Schedule)การก่อสร้างโครงการ
 2) ขออนุมัติแบบแปลน
 3) ขออนุมัติการทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและวินาศภัย
 * ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 5 (รายงานประจำเดือนมีนาคม) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 เม.ย 65



แผนการก่อสร้างโครงการ																									
ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลา (เดือนที่)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	งานเตรียมก่อสร้าง																								
	1.1 งานถมพื้นที่																								
	1.2 ขุดบ่อเก็บกักน้ำและแปลงเก็บน้ำ																								
	1.3 ขุดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร																								
2	งานก่อสร้างอาคาร																								
	2.1 ก่อสร้างอาคาร																								
	2.2 ก่อสร้างถนน ระบบระบายน้ำ ประปา																								
	2.3 ก่อสร้างรั้ว																								
3	ติดตั้งเครื่องจักร																								
4	ติดตั้งระบบไฟฟ้า																								
5	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ																								
6	ทดสอบการติดตั้งเครื่องจักร																								
7	ทดสอบการเดินระบบทั้งหมด																								
8	ทดสอบการเดินเครื่องทำน้ำเย็นไฟฟ้า ขนานกับฟาร์ม																								
9	เริ่มขายไฟฟ้า																								



*ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559

★
ต้องมีการลงนามรับเอกสาร
และระบุวันที่จากหน่วยงานที่รับเอกสาร

ดาวน์โหลด

"รายการตรวจสอบก่อนการรับฟังความคิดเห็น"

ให้เสร็จก่อน

"การรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย"



(กรณีไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EIA
เช่น โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชน)

ตั้ง กกท. เฉพาะ
เพาโวล > 10 MW

0

ตั้ง กกท. รับฟัง
(ข้อ 6*)

START

1

ติดประกาศ / ให้ข้อมูล
(ข้อ 7, 8*)

≥ 15 วัน

2

จัดเวทีรับฟัง
(ข้อ 9*)

ยกเว้นไปเพาโวล
< 10 MW

3

รับข้อสังเกต
(ข้อ 9*)

≥ 15 วัน
นับจาก
จัดเวทีเสร็จ

ข้อมูลโครงการ (ต้องดำเนินการทุกข้อ)

- ✓ ระบุชื่อ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ✓ สถานะปัจจุบันของโครงการ
- ✓ ชื่อผู้ประสานงานในอนุญาต
- ✓ ที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ
- ✓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ
- ✓ ระบุพื้นที่ชุมชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
- ✓ ประเมินผลกระทบจากการดำเนินการ
- ✓ กำหนดการและสถานที่รับฟังความคิดเห็น
- ✓ แผนการนำความคิดเห็นไปใช้

ข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
(ต้องดำเนินการทุกข้อ)

- ✓ พื้นที่โครงการ
- ✓ สำนักงาน กพพ. ประจำเขต ในพื้นที่โครงการ
- ✓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่โครงการ
- ✓ ที่ทำการอำเภอในพื้นที่โครงการ และในพื้นที่ใกล้เคียง
- ✓ ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
- ✓ ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร

5

ปิดประกาศผล
(ข้อ 11*)

≥ 15 วัน

4

สรุปผลการรับฟัง
(ข้อ 10*)

≤ 15 วัน

ผลการรับฟัง มีอายุ 6 เดือน
นับจากวันสุดท้ายที่ปิดประกาศผล
แล้วเสร็จ เพื่อประกอบการพิจารณา
ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ต้องทำวันที่..... ถึงวันที่.....)

- สถานที่ตั้งประกาศ (ต้องดำเนินการทุกข้อ)
- ✓ พื้นที่โครงการ
- ✓ สำนักงาน กพพ. ประจำเขต ในพื้นที่โครงการ
- ✓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่โครงการ
- ✓ ที่ทำการอำเภอในพื้นที่โครงการ และในพื้นที่ใกล้เคียง
- ✓ ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
- ✓ ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร
- ระยะเวลาเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 15 วัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น

- โดยมีรายละเอียด (ต้องดำเนินการทุกข้อ) ดังนี้
- ✓ จัดเวทีรับฟัง (วัน เวลา และสถานที่จัดรับฟังความคิดเห็น)
- ✓ รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟัง
- ✓ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
- ✓ บันทึกความเห็นและข้อสังเกต
- ✓ คำชี้แจงข้อสงสัยจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรณีมีประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียน)



กพพ.
ERC
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
www.erc.or.th
โทรศัพท์ 02-207-3599



การรับฟัง
ความคิดเห็นฯ
ประกอบการขอ
ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า



การรับฟังความคิดเห็นกับการขอรับใบอนุญาต

โรงไฟฟ้าทุกประเภท

กำลังการผลิตติดตั้ง < 10 MW

โรงไฟฟ้าที่ไม่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงาน
เช่น Solar Wind เป็นต้น

โรงไฟฟ้าขนาดเล็กชุมชน >= 10 MW ขึ้นไป



ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
(ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

กำลังการผลิตติดตั้ง >= 10 MW



ก่อนก่อสร้าง

ระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความเห็น
และความเข้าใจกับประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในการพิจารณาอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559

ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาต
ขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

สามารถกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พ.ศ. 2548 หรือแนวทางตามกำหนดของ
ภาคของส่วนท้องถิ่นกำหนด

ม.ร.ท.

ส.อ.4

อ.1

รับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยนำผล
การรับฟังความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
EIA/EHIA ประกอบการขอรับใบอนุญาตตาม
กฎหมายต่างๆ ต่อไป

ช่วงก่อสร้าง

*ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วม เช่น ต้องเผยแพร่เรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งความทราบเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและกิจกรรม CSR เป็นต้น

*ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วม เช่น ต้องเผยแพร่เรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งความทราบเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและกิจกรรม CSR เป็นต้น

อ.6

ก่อน COD

พ.ศ.2

แจ้งเริ่มตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

COD
(เริ่มประกอบกิจการ)

หมายเหตุ :

การรับฟังความคิดเห็นสามารถดำเนินการได้ก่อนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และดำเนินการในคราวเดียวกันได้
เนื่องจากระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจ
กับประชาชน กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
และระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงาน กทพ.
ประจำเขต (สข.)



ก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังตามระเบียบให้ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน กทพ. ประจำเขตต่างๆ

เขต 1

เชียงใหม่

เขต 2

พิษณุโลก

เขต 3

นครสวรรค์

เขต 4

ขอนแก่น

เขต 5

อุบลราชธานี

เขต 6

นครราชสีมา

เขต 7

สระบุรี

เขต 8

ชลบุรี

เขต 9

กาญจนบุรี

เขต 10

ราชบุรี

เขต 11

สุราษฎร์ธานี

เขต 12

สงขลา

เขต 13

นนทบุรี

อะไร.. ทำไม.. อย่างไร???

1



ถ้ามีการทำ "รับฟังความคิดเห็น" และรวบรวมสรุปผลใน "รายงาน IEE" แล้ว ยังต้องการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ
กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ อีกหรือไม่ ?

ตอบ

ตามระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ ไม่บังคับกับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน IEE ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น ถ้าเป็น IEE ตามกฎหมายอื่นหรือผู้ประกอบการ
สมัครใจจัดทำขึ้นเอง ยังคงต้องทำตามระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ และต้องจัดทำ "กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น" ก่อนที่จะดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการ หรือก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วกันด้วย

2



กรณีเข้าข่ายเป็นโครงการ EIA/EHIA ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ 2560 มาตรา 58 ระบุไว้ว่าต้องให้หน่วยงาน
อนุญาตจัดรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุญาตหรือดำเนินการใดๆ หมายความว่าอย่างไร และผู้ประกอบการต้องทำอะไรบ้าง ?

ตอบ

ผู้ประกอบการประกอบกิจการสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยการกระบวนกรในการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับโครงการหรือกิจการ
หรือการดำเนินการใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง พ.ศ. 2561



TIPS

ตามระเบียบ กทพ. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นฯ จะมีระยะเวลาอย่างไร ?



การเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนการตัดสินใจลงทุนภายใน 15 วัน

- พิจารณาบันทึกว่าวันก่อนหน้าสุดท้ายที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสาร
- ในกรณีที่มีการส่งเอกสารต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
แสดงหลักฐานการส่งเอกสารและใบส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม !!

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม **ล่วงหน้า** ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ที่ได้ออกหรือยื่นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสามารถทำได้ เนื่องจากอาจส่งผลให้
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องตามระเบียบฯ
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม **ล่าช้า** โดยผู้ประกอบการ
ใบอนุญาตจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงาน กทพ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
- ต้องดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบฯ
ทั้ง 5 กลุ่ม กรณีเป็นการขอรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยทั่วถึงกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องแนบหลักฐานแสดง
ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุมประกอบการ
ยื่นรายงานการรับฟังความคิดเห็นฯ ด้วย

Pre-construction Licensing

(การขออนุญาตก่อนก่อสร้าง)



ผู้ประกอบกิจการ
พลังงาน



สำนักงาน กกพ.



1 ยื่นขออนุญาต A, B, C



4 เริ่มก่อสร้าง
นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

2 ขอความเห็นหน่วยงานอื่น
ตาม ม.48



ผังเมือง



สอจ./กรอ.



ราชการท้องถิ่น

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงาน (MoU)

3 กกพ. ออกใบอนุญาต

A. ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า



75 วัน

ออกพร้อมหรือออกหลัง ร.ง.4

1,000 kVA

ยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า
(ต้องขออนุญาต กกพ.)

B. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)



90 วัน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.4 ลำดับที่ 88)

ต้องขออนุญาต กกพ. โดยขอความเห็น กรอ.
ขนาดแรงม้าเครื่องจักรตั้งแต่ 5 HP

**C. ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (อ.1)**



45 วัน

ใช้เอง*
ท้องถิ่นอนุญาต

จำหน่ายและใช้เอง*
• กกพ. อนุญาต
อาคารตามรายการ
ใน MoU
• ท้องถิ่น อนุญาต
อาคารอื่นๆ

จำหน่ายเป็นการเฉพาะ
กกพ. อนุญาต
ทุกประเภทอาคาร

ขนาดกำลัง
การผลิตติดตั้ง
150 MW

จำหน่ายเป็นการเฉพาะ
กกพ. อนุญาต
ทุกประเภท
อาคาร

ใช้เอง หมายถึง การนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ในการ
อุตสาหกรรมของตนเองหรือธุรกิจต่อเนื่อง

Permit to Operate

(การขออนุญาตก่อนประกอบกิจการ)

หลังก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
ใกล้แล้วเสร็จ



5 ยื่นขออนุญาต D, E



8* แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
/ให้เอกชน

6 ขอความเห็นหน่วยงานอื่น
ตาม ม.48



ท้องถิ่น



พพ.

ขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
เป็นไปตามข้อตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงาน (MoU)

7 กกพ. ออกใบอนุญาต

**D. ใบรับรองการก่อสร้าง
อาคาร (อ.6)**



30 วัน

E. ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานความคุม (พค.2)



120 วัน

200 kVA

ยกเว้นไม่ต้อง
ขอรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานความคุม (พค.2)
(ต้องขออนุญาต กกพ. โดยขอความเห็น พพ.)
(ต้องขออนุญาต พพ. - กรณีไม่เข้าข่าย
เป็นการประกอบกิจการพลังงาน)

ไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต


หมายเหตุ : เฉพาะกรณีเข้าข่ายเป็นอาคาร
ที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
หรืออาคารพาณิชย์กรรมและสำนักงาน
ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป

*หมายเหตุ : ก่อนเริ่มประกอบกิจการต้องแจ้งเริ่มต่อสำนักงาน กกพ.

แผนงานการขอรับใบอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าเกาะแก้ว จ.สงขลา

[illegible]

ขั้นตอนการพิจารณาโครงการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดการมูลฝอย

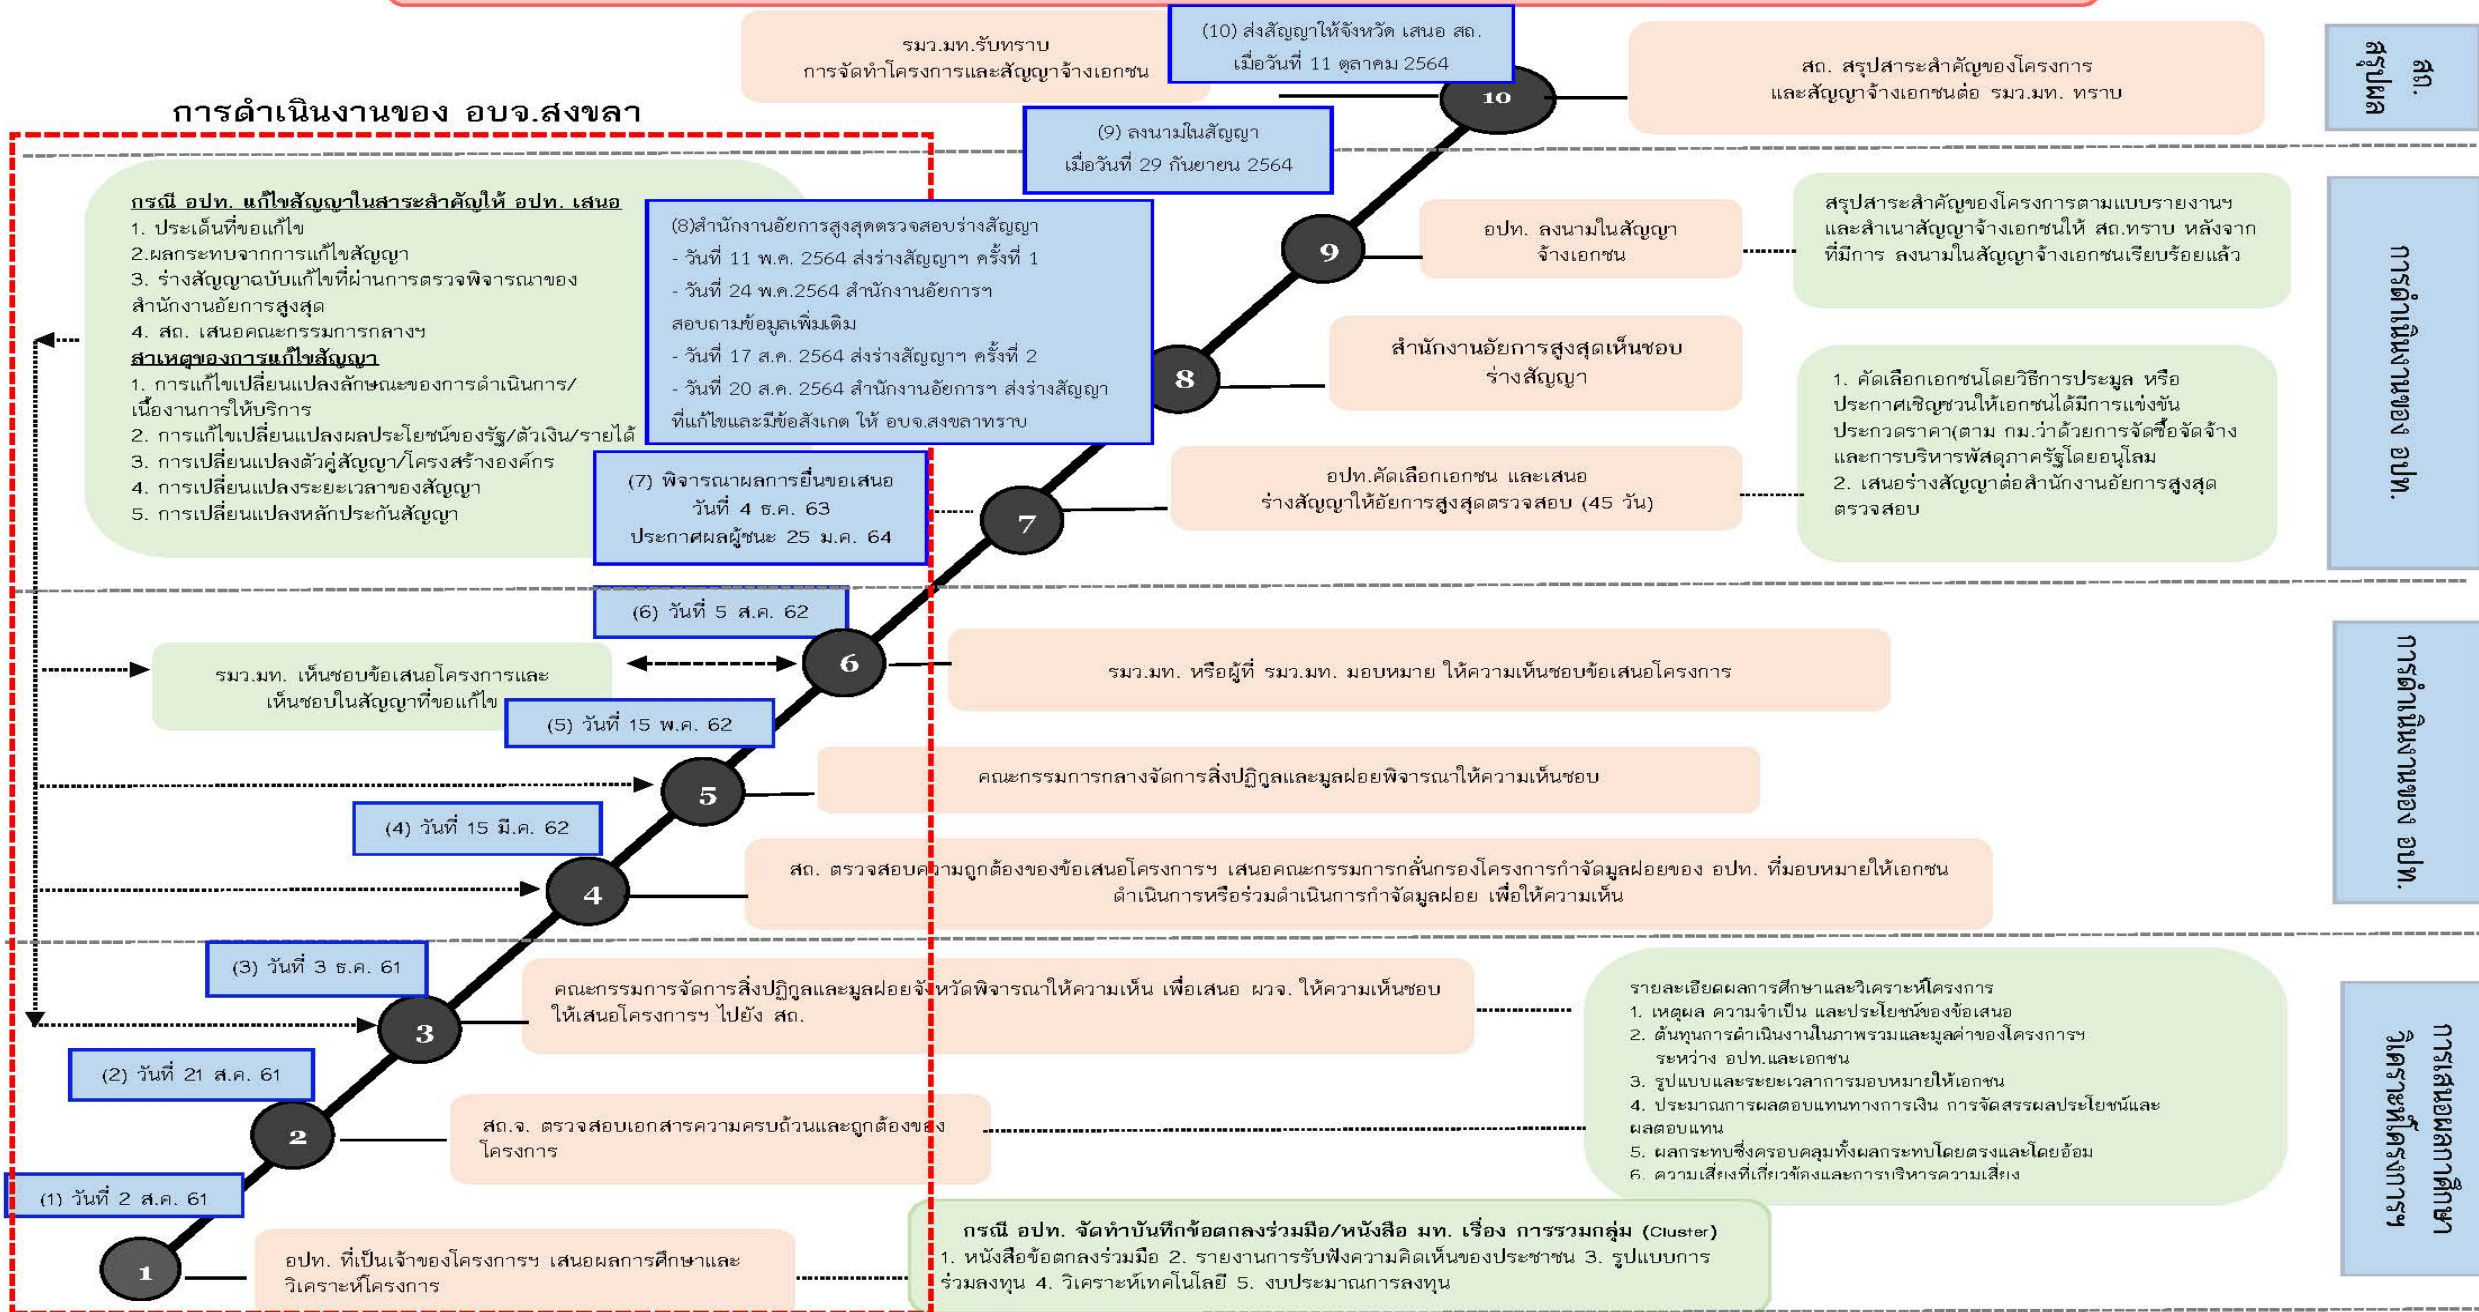




โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณจัดสรร 47,126,400 บาท


การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ 47,126,400 บาท

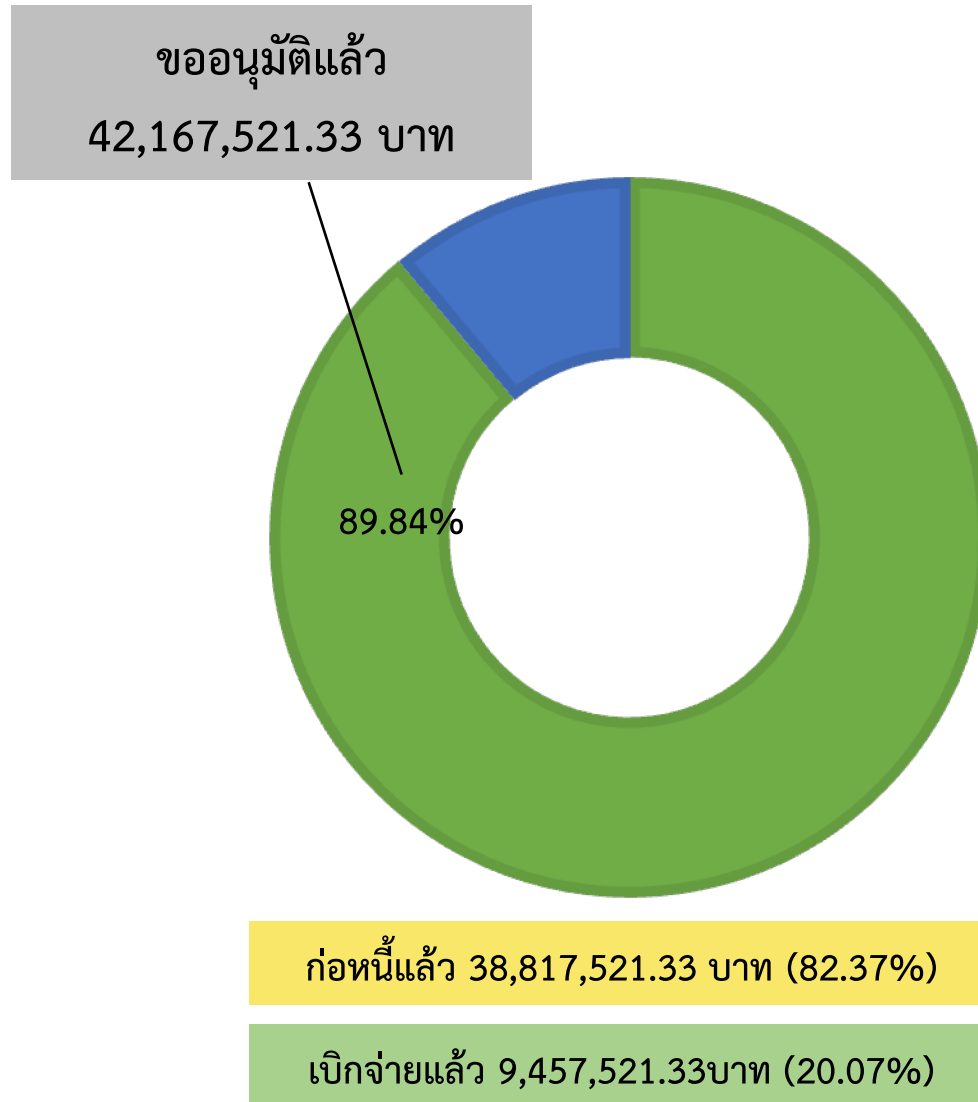

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) งบประมาณ 8,000,000 บาท



ขออนุมัติโครงการ

1

วันที่ 1 ต.ค. 64

ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงาน
ที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง

2

วันที่ 7 ต.ค. 64

ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ

3

วันที่ 15 ต.ค. 64

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกที่ปรึกษา)

4

ประกาศผลผู้ชนะ
(บ.ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด)

ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา

5

ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65

ดำเนินการโครงการฯ (ระยะเวลา 270 วัน)

6

ตรวจรับงานงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65

หมายเหตุ ★ การดำเนินการปัจจุบัน

กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่



โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค (Sky Walk) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งบประมาณ 12,000,000 บาท



หมายเหตุ การดำเนินการปัจจุบัน

กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันอังคารที่ 19 เม.ย. 65 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่



ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ขออนุมัติโครงการ	■											
2.	ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (tor) และราคากลาง และขออนุมัติดำเนินการโครงการ		■										
3.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (คัดเลือกที่ปรึกษา)			■									
4.	ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา				■								
5.	ดำเนินการโครงการฯ (ระยะเวลา 270 วัน)					■	■	■	■	■	■	■	■



การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

โครงการศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา งบประมาณ 15,000,000 บาท



ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม




กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องณภัทรพา รดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะเบต เวคชั่น
ราชมั่งคลา อ.เมือง จ.สงขลา



การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)


โครงการติดตามและประเมินผลระบบผังเมืองรวม งบประมาณ 200,000 บาท

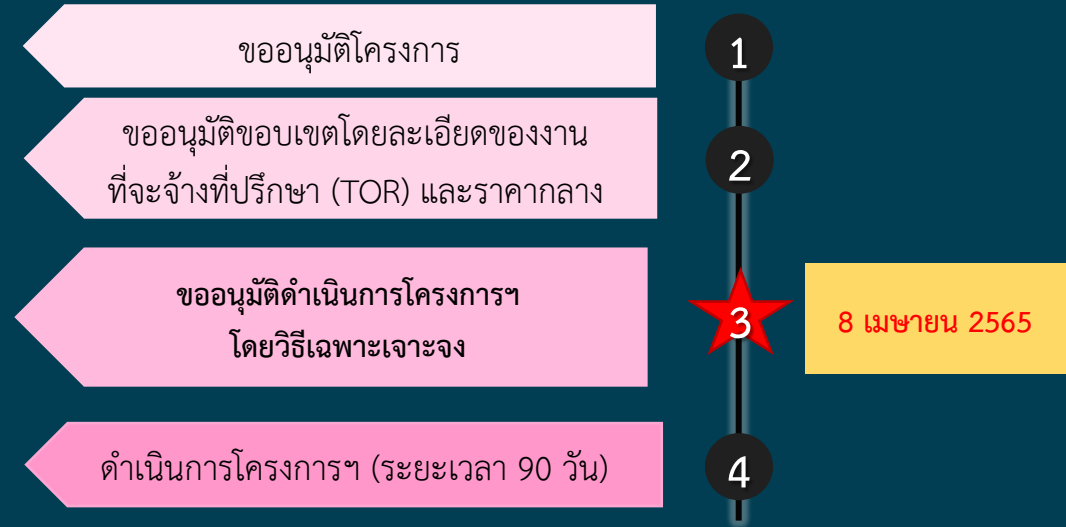

หมายเหตุ ★ การดำเนินการปัจจุบัน

ลำดับที่	รายละเอียดกิจกรรม	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	ขออนุมัติโครงการ												
2.	ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง และขออนุมัติดำเนินการโครงการ												
3.	ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง												
4.	ดำเนินการโครงการฯ (ระยะเวลา 90 วัน)												

พื้นที่ดำเนินการ
ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

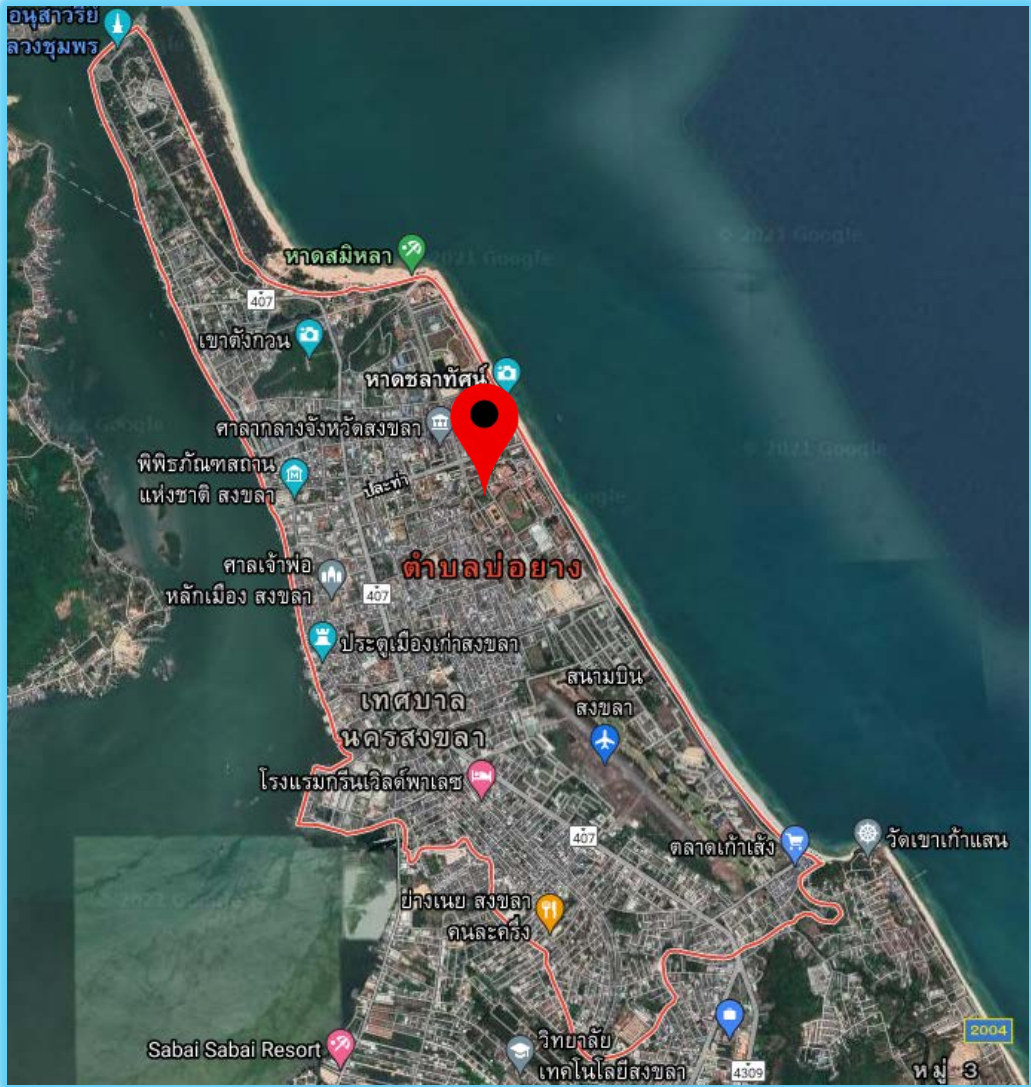

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อองฬานานาชาติ บ้านศรัทธา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา งบประมาณก่อสร้าง 5,000,000 บาท งบประมาณออกแบบ 225,000 บาท

- 1 ขออนุมัติโครงการ
- 2 ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง
- 3 ขออนุมัติดำเนินการโครงการฯ
- 4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 5 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
- 6 ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการฯ (ระยะเวลา 60 วัน)



มีหนังสือเชิญชวน
ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
(หจก. เกสรบัว แลนด์สเคป)
เมื่อ วันที่ 12 เม.ย. 65
กำหนดยื่นข้อเสนอ
ในวันที่ 25 เม.ย. 65



การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ขออนุมัติโครงการ

1

วันที่ 30 ก.ย. 64

แจ้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากการขอใช้ที่
ราชพัสดุเป็นขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่
สข.21 (สนามกีฬาติณสูลานนท์)

2

วันที่ 7 ต.ค. 64

สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการขอ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ

3

วันที่ 28 ก.พ. 65



ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

4

วันที่ 5 เม.ย. 65

สอบถามอัตราค่าเช่าพื้นที่
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช , โรงแรมเดอะเบด
เวเคชั่น ราชมังคลาและโรงแรมสงขลาเมอร์เมด

หมายเหตุ  การดำเนินการปัจจุบัน

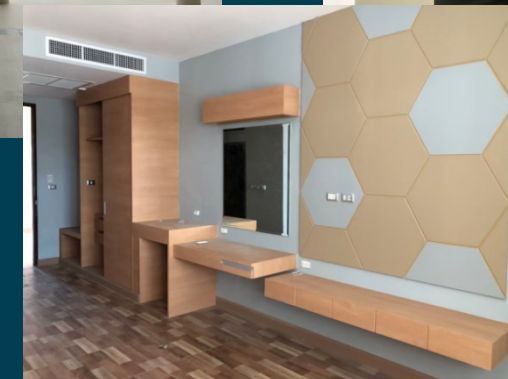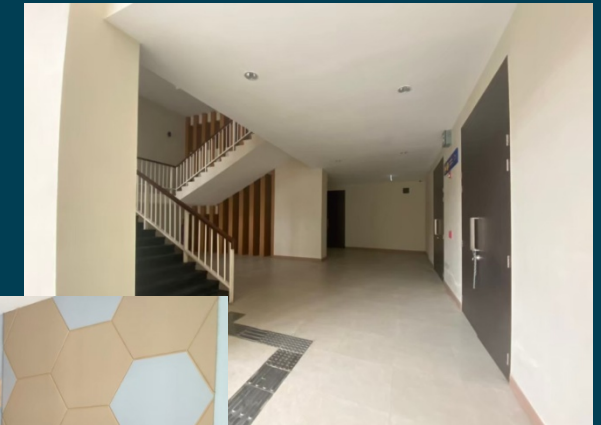

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการถนนเชื่อมด้านศุลกากรแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบประมาณสำนักการช่าง 3,937,000 บาท

- ขออนุมัติโครงการ
- ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
- ขออนุมัติขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (TOR) และราคากลาง
- ขออนุมัติดำเนินการโครงการ
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ลงนามในสัญญาจ้าง
- ดำเนินการจ้างออกแบบ (150 วัน)

1

วันที่ 23 พ.ย. 64

2

วันที่ 30 พ.ย. 64

3

ประกาศเมื่อ
วันที่ 9 ธ.ค. 64

4

วันที่ 16 ธ.ค. 64

5

ประกาศผลผู้ชนะ ได้แก่
บริษัท พีวีเอส95 จำกัด


6

10 มี.ค. 65

7

กำหนดส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 25 เม.ย. 65

หมายเหตุ  การดำเนินการปัจจุบัน

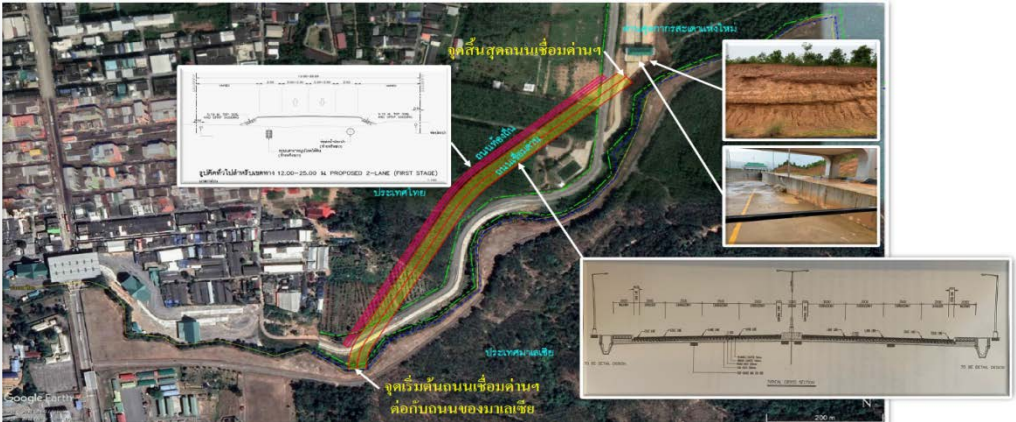

ที่ตั้ง

โครงการถนนเชื่อมด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา



Project Timeline

โครงการถนนเชื่อมด้านสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ธันวาคม 2564	ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565
วางแผน Centerline ถนนเชื่อมด้านสะเดาแห่งใหม่ และคณะกรรมการฯ ประชุมเห็นชอบ	สำรวจภูมิประเทศสำรวจธรณีวิทยาและทดสอบวัสดุสำรวจกันเขตที่ดิน	ออกแบบถนนเชื่อมออกแบบถนนท้องถิ่นออกแบบป้องกันลาดเชิงเขาออกแบบปรับปรุงช่องจราจรทางเข้าด้านฯ	จัดทำรายการคำนวณวิศวกรรมจัดทำปริมาณงานก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนเชื่อมด้านสะเดาแห่งใหม่ และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้
ปรับแบบถนนให้เหมาะสม	สำรวจและออกแบบป้องกันดิน	ออกแบบรายละเอียด	จัดทำเอกสารประกวดราคา	ก่อสร้างโครงการ
- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน - ผู้รับผิดชอบ อบจ. - ชุด ศุลกากร ทางหลวง	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน - ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการฯ - อบต.ศุลกากร ทางหลวง	- ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน - ผู้รับผิดชอบ อบจ.	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน - ผู้รับผิดชอบ อบจ.	- ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน - ผู้รับผิดชอบ อบจ. - อบต.ศุลกากร ทางหลวง

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

โครงการถนนเชื่อมด้านศุลกากรแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา งบประมาณสำนักงานการช่าง 3,937,000 บาท (ต่อ)

หนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๕๐๐๒๖/๕๒๕/๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ถนนสงขลา - ระโนด สข ๕๐๑๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ


๒. แบบแปลนขั้นต้น (Conceptual Design) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการ
เปิดให้บริการและอำนวยความสะดวก ณ ด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติ
มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เร่งจัดทำแบบแปลนขั้นต้น (Conceptual Design) เชื่อมด้าน
ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด้านบูติกกาบูติคิมของมาเลเซียให้เสร็จ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลางปี ๒๕๖๕) จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กพต.) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลนขั้นต้น (Conceptual
Design) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อที่จังหวัดสงขลาจะได้เสนอขอความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครพลพรหมาน กาเหรัมย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ/งาน	งบประมาณรวม (บาท)	ปีงบประมาณ (บาท)	
			๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑	งบดำเนินงาน	-	-	-
๑	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-
๑	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
๒	งบลงทุน	๒๔๗,๑๕๐,๐๐๐	๑๗๐,๔๘๐,๐๖๗	๗๖,๖๖๙,๙๓๓
๒.๑	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๘๒,๓๕๐,๕๐๐	๗๒,๖๓๓,๖๐๐	๙,๗๑๖,๙๐๐
๒.๑.๑	ค่าที่ดิน	๖๒,๘๓๖,๘๐๐	๖๒,๘๓๖,๘๐๐	-
๒.๑.๑.๓	ค่ารั้วและออกหนังสือสำคัญที่หลวง (๓.๕%)	๒,๐๗๕,๘๐๐	๒,๐๗๕,๘๐๐	-
๒.๑.๑.๒	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดิน จัดซื้อที่ดิน (๒.๕%)	๑,๕๘๖,๐๐๐	๑,๕๘๖,๐๐๐	-
๒.๑.๑.๓	ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	๕๙,๒๘๐,๐๐๐	๕๙,๒๘๐,๐๐๐	-
๒.๑.๒	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	๑๙,๕๑๓,๖๐๐	๙,๙๗๖,๔๐๐	๙,๕๓๗,๒๐๐
๒.๑.๒.๑	ค่าเตรียมงานเบื้องต้น	๙,๙๗๖,๔๐๐	๙,๙๗๖,๔๐๐	-
๒.๑.๒.๒	ค่าเปิดงานก่อสร้าง	๙,๕๓๗,๒๐๐	-	๙,๕๓๗,๒๐๐
๒.๑.๓	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
๒.๑.๓.๑	บูรณะสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
๒.๑.๓.๒	บูรณะถนน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐
๒.๒	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	๑๕๙,๒๒๖,๖๖๗	๙๙,๕๒๒,๖๖๗	๖๙,๗๐๔,๐๐๐
๒.๒.๑	งานถนนเชื่อมด้านสะเดา ๖ ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความยาว ๔๕๐ เมตร เขตทาง ๓๐ เมตร	๘๘,๕๐๐,๐๐๐	๕๓,๓๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๕๐,๐๐๐
๒.๒.๒	งานถนนเชื่อมด้านสะเดา ๒ ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความยาว ๘๕๐ เมตร เขตทาง ๓๐ เมตร	๓๕,๓๖๐,๐๐๐	๒๑,๒๑๖,๐๐๐	๑๔,๑๔๔,๐๐๐
๒.๒.๓	งานป้องกันลาดเชิงเขา	๑๙,๔๖๖,๖๖๗	๑๙,๔๖๖,๖๖๗	-
๒.๒.๔	งานปรับปรุงทางเข้าด้านา	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๒.๓	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	๕,๕๑๓,๙๓๓	๓,๓๕๓,๙๓๓	๒,๑๖๐,๐๐๐
๒.๓.๑	ค่าบริหารโครงการและควบคุมงาน (๓.๕%)	๕,๕๑๓,๙๓๓	๓,๓๕๓,๙๓๓	๒,๑๖๐,๐๐๐
๒.๔	งบประมาณตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-	-
๓	เมื่อเหลือเมื่อขาด (๓%)	๙,๗๑๖,๙๐๐	๒,๘๖๖,๐๘๐	๖,๘๕๐,๘๒๐
รวมทั้งสิ้น		๒๕๑,๙๖๖,๘๐๐	๑๗๓,๓๖๖,๑๐๗	๗๘,๖๐๐,๖๙๓

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕๑,๙๖๖,๘๐๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าพันเก้าบาทถ้วน)


กองผังเมือง ฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง

โทร. ๐ ๙๔๔๔๔ ๐๙๖๒๒ ต่อ ๓๓๓

www.songkhlapao.go.th

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)


โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Songkhla Riviera Road) งบประมาณ 15,000,000 บาท

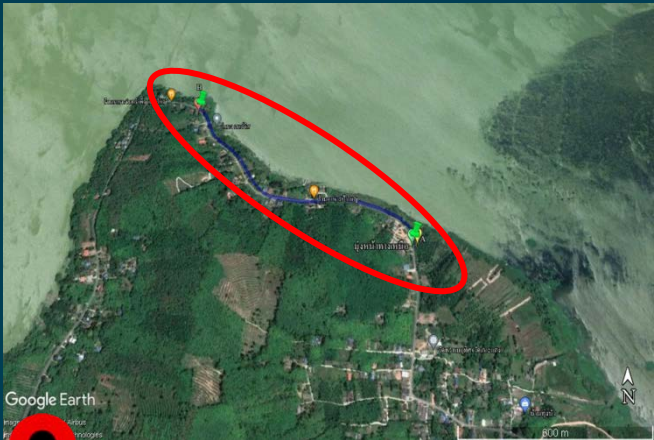


ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสดินรุ้ง
สข.ถ. 1-0059 : สาย บ.เจดีย์งาม - บ.เกาะใหญ่ ระยะ 1 กม.



ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร
สข.ถ. 1-0124 : สาย บ.ม่วงงาม - บ.เกาะน้ำรอบ ระยะ 1.8 กม.

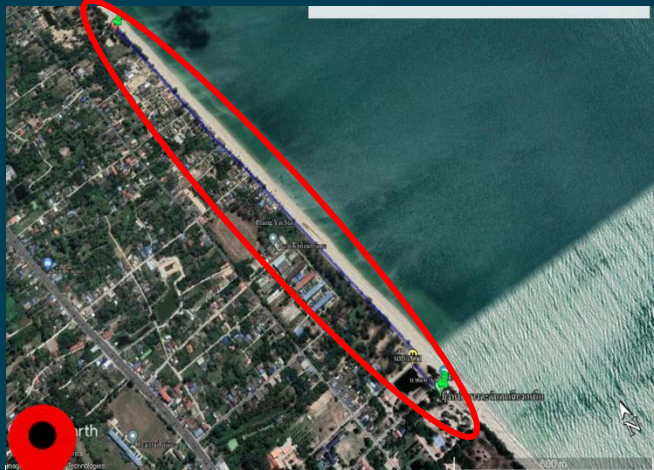

ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ
สข.ถ. 1-0195 : สาย เลียบริมทะเล ม.2 - ม.6 ระยะ 1.8 กม.

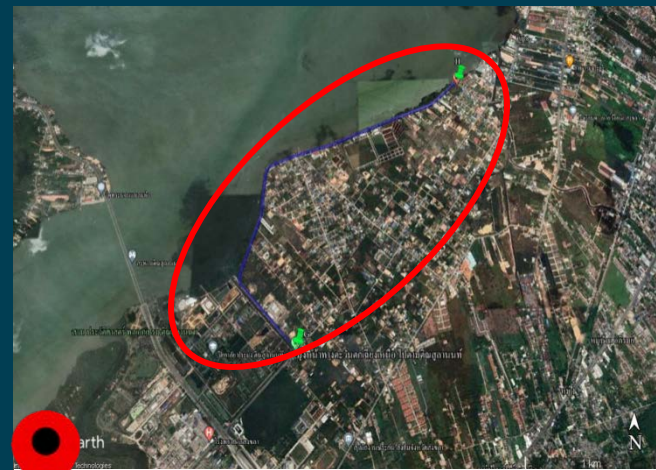

ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
สข.ถ. 1-0111 : สาย ดินสุลтанนท์ ระยะ 3.6 กม.

การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

โครงการ TK Park งบประมาณเบื้องต้น 20,000,000 บาท

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโครงการ



หมายเหตุ ★ การดำเนินการปัจจุบัน



การดำเนินการโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

โครงการ Co - Working Space งบประมาณเบื้องต้น 7,000,000 บาท

ปัจจุบัน

การออกแบบแปลน และกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ



หมายเหตุ ★ การดำเนินการปัจจุบัน
